

GESTIÓN DE **PROYECTOS**

Índice de **C O N T E N I D O S**

- | | |
|---|--|
| 01. Introducción + TP | 05. MS Project / Project Libre - C1 |
| 02. Project Charter + Stakeholders | 06. MS Project / Project Libre -C2 |
| 03. Alcance +WBS | 07. Plan de comunicación |
| 04. Cronograma | 08. Presentación de TP |

DOCENTES

*UNRaf Escuela de verano



Juan Pablo Dona

Ingeniero Industrial
Ingeniero en Calidad - SanCor Salud
Docente Unraf - AGI



Francisco Serrano

Ingeniero Industrial con posgrado en Project
Management
Ingeniero en Calidad - SanCor Salud
Docente Unraf - AGI

CRONOGRAMA

Día		JUEVES								horas
Mes	FEBRERO				MARZO					
	5	12	19	26	5	12	19	26		
Encuentro 1		2							2	
Encuentro 2			2						2	
Encuentro 3				2					2	
Encuentro 4					2				2	
Encuentro 5						2			2	
Encuentro 6							2		2	
Encuentro 7								2	2	
Encuentro 8								2	2	
Total horas									16	

INTRODUCCIÓN

A

PROYECTOS

B

FACTORES / OBJETIVOS

01

REQUISITOS
REGULATORIOS, LEGALES
O SOCIALES

02

SATISFACER SOLICITUDES O
NECESIDADES DE LOS INTERESADOS

03

IMPLEMENTAR O CAMBIAR
ESTRATEGIAS DE NEGOCIO

04

CREAR O MEJORAR PRODUCTOS,
PROCESOS O SERVICIOS.

UN PROYECTO PUEDE GENERAR

01 UN SERVICIO

02 UN PRODUCTO


03 UN RESULTADO

04 UNA MEJORA DE
LINEAS DE PRODUCTO
O SERVICIOS


QUE ES UN PROYECTO?

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio o resultado **único** para lograr un objetivo con restricciones de tiempo y dinero”

PMBOK:

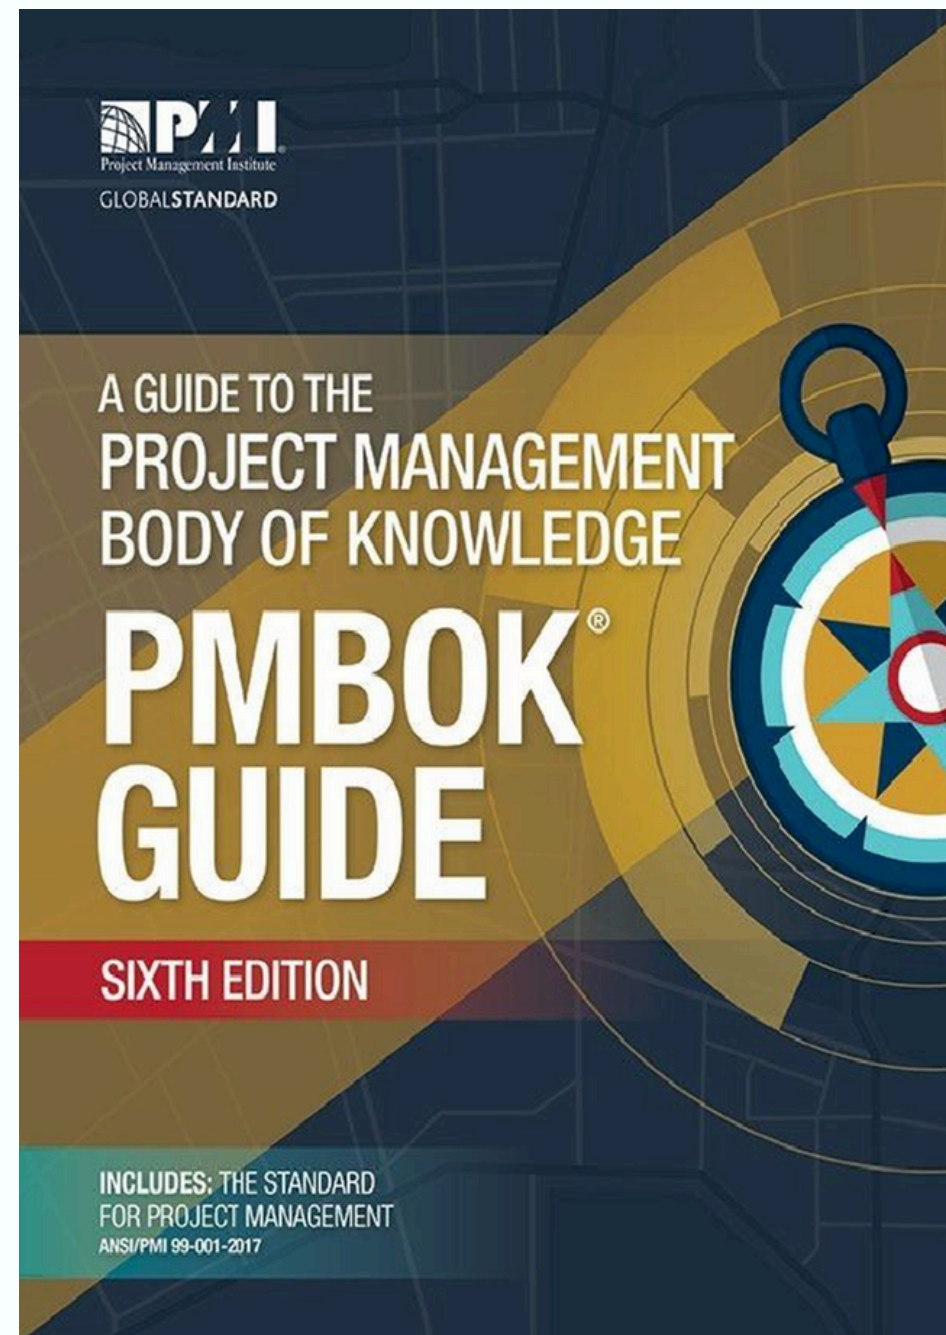

* UNRaf Escuela de verano

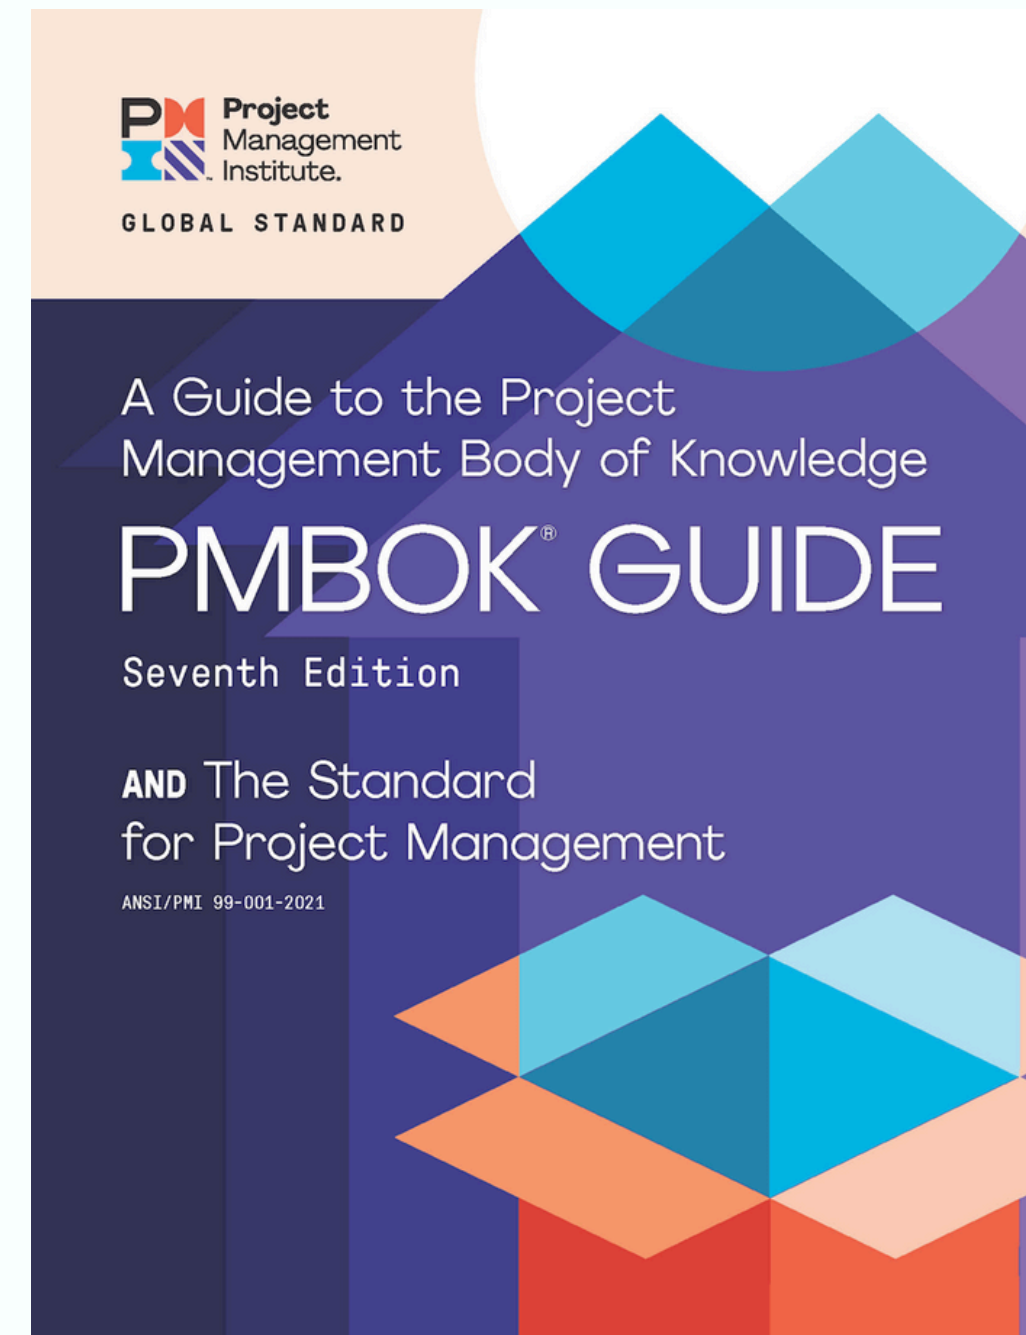

LA TRIPLA RESTRICCIÓN

Proyecto exitoso:

El que cumple todos los objetivos, con el costo presupuestado, y en el tiempo estimado.



EL ÉXITO DEL PROYECTO

- Como se mide?
- Como se define?
- Cuales son los factores que ayudan?



CICLO DE VIDA DE PROYECTOS



PROYECTO O PRODUCTO?

Cual tiene mayor duración?



TIPOS DE PROYECTOS

PREDICTIVO

- Alcance costo y tiempo definidos en forma temprana
- Fases secuenciales y consecutivas
- Producto a entregar bien definido y existe conocimiento en como construirlo

ITERATIVO E INCREMENTAL

- Se repiten actividades del proyecto en fases o iteraciones
- Al final de cada fase se completa un entregable
- Objetivos poco definidos o de alta complejidad, o cuando entrega parcial del producto es clave


ÁGILES

- Niveles altos de cambio y participación continua de los interesados
- Centrados en el flujo (Kanban) o centrados en ciclos incrementales (Scrum)
- Entornos que cambian rápidamente y el alcance es confuso. Con equipos altamente involucrados

CONSIDERACIONES PARA SELECCIONAR UN ENFOQUE

- Requisitos y reglamentos precisos
- Procesos organizativos estrictos
- Participación de los clientes en los avances del proyecto
- Naturaleza del proyecto
- Alcance temporal del proyecto
- Presupuesto del proyecto

AREAS DE CONOCIMIENTO

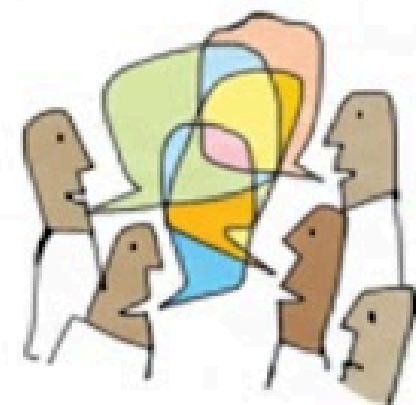

Requerimientos



EL ROL DEL PM Y EL ENTORNO

"La cultura organizacional es un conjunto de valores compartidos, creencias, suposiciones, hábitos, lenguaje y otros factores que guían las conductas de los trabajadores y las decisiones que se toman en la organización. Todos estas factores **influyen** en cómo se realizan los proyectos y su éxito."

Bonnie Biafore

RESPONSABILIDADES DEL PM

- Planificación del proyecto
- Definición de objetivos y alcance
- Creación de cronogramas y asignación de recursos
- Organización y coordinación
- Formación y liderazgo del equipo de proyecto
- Comunicación efectiva con los interesados
- Seguimiento y control
- Identificación y gestión de riesgos



OPCIONES PARA EL TP GRUPAL

- **Ej 1:** Implementación de un sistema de turnos y atención digital para un centro de salud municipal, incluyendo capacitación del personal y comunicación a la comunidad.
- **Ej 2:** Organización y puesta en marcha de una feria regional de emprendedores de tres días, con logística, stands, sponsors y difusión.
- **Ej 3:** Diseño y lanzamiento de una plataforma de cursos online para una institución educativa, incluyendo contenidos, tecnología y plan de lanzamiento.
- **Ej 4:** Remodelación integral de una biblioteca pública para transformarla en un espacio cultural multifunción.
- **Ej 5:** Organización de un viaje grupal de fin de curso al exterior, considerando presupuesto, logística, riesgos y gestión de interesados.

OPCIONES PARA EL TP GRUPAL

- **Ej 6:** Puesta en marcha de un emprendimiento gastronómico de pequeña escala (food truck o pop-up), desde la idea hasta la primera jornada de venta.
- **Ej 7:** Planificación y ejecución de un evento corporativo internacional híbrido (presencial + virtual).
- **Ej 8:** Implementación de un sistema de gestión de residuos y reciclado en una universidad, con campañas de concientización y medición de impacto.
- **Ej 9:** Producción y lanzamiento de un podcast o canal de contenidos digitales con una temporada completa definida.
- **Ej 10:** Lanzamiento (línea de producción y marketing) de una nueva línea de productos cosméticos veganos.

MUCHAS
GRACIAS
