




Capítulo 03 PMBOK Integración

- Áreas de conocimiento proyecto
- Acta de constitución del proyecto (Project Charter)

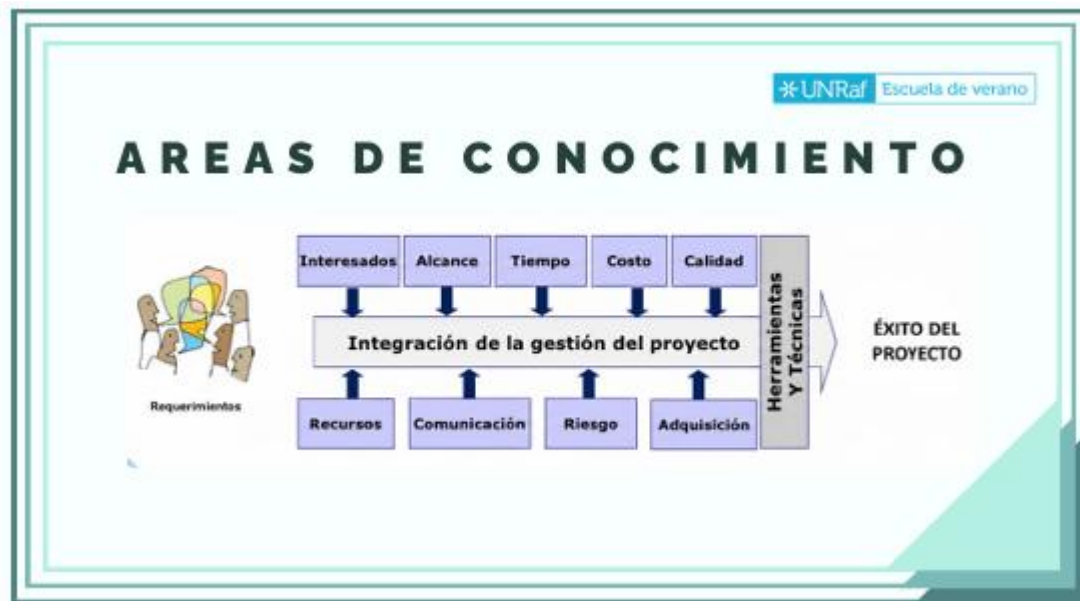

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. En el contexto de la dirección de proyectos, la integración incluye características de unificación, consolidación, comunicación e interrelación. Estas acciones deberían aplicarse desde el inicio del proyecto hasta su conclusión. La Gestión de la Integración del Proyecto incluye tomar decisiones sobre:

- Asignación de recursos
- Equilibrio de demandas que compiten entre sí
- Examen de enfoques alternativos
- Adaptación de los procesos para cumplir con los objetivos del proyecto
- Gestión de las interdependencias entre las Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos.

Los procesos de Gestión de la Integración del Proyecto son:

4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto—Es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto.

4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto—Es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los componentes del plan y consolidarlos en un plan integral para la dirección del proyecto.

4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto—Es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto e implementar los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del proyecto.

4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto—Es el proceso de utilizar el conocimiento existente y crear nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos del proyecto y contribuir al aprendizaje organizacional.

4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto—Es el proceso de hacer seguimiento, revisar e informar el avance general a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto.

4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios—Es el proceso de revisar todas las solicitudes de cambio, aprobar y gestionar los cambios a entregables, activos de los procesos de la organización, documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto, y comunicar las decisiones.

4.7 Cerrar el Proyecto o Fase—Es el proceso de finalizar todas las actividades para el proyecto, fase o contrato.



*UNRaf Escuela de verano

INTEGRACIÓN

- **Desarrollar el Acta de constitución del proyecto (Project Charter)**
- Desarrollar el Plan para la dirección del proyecto
- Dirigir y Gestionar el trabajo del proyecto
- Gestionar el conocimiento del Proyecto
- Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
- Realizar el control integrado de los cambios
- Cerrar el proyecto o Fase

La gestión de la integración del proyecto se encarga de coordinar y articular todas las áreas involucradas, asegurando que el proyecto avance de forma ordenada y alineada con sus objetivos. Incluye la definición inicial mediante el acta de constitución, la planificación del trabajo, el seguimiento del desempeño, la gestión de cambios y el cierre formal, permitiendo mantener coherencia y control a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

La integración es clave para evitar esfuerzos aislados o decisiones contradictorias dentro del proyecto. A través de una visión global, el director del proyecto toma decisiones informadas, prioriza el trabajo y gestiona los cambios de manera controlada, asegurando que todas las actividades contribuyan al objetivo final del proyecto.



DESARROLLAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. Los beneficios clave de este proceso son que proporciona un vínculo directo entre el proyecto y los objetivos estratégicos de la organización, crea un registro formal del proyecto y muestra el compromiso de la organización con el proyecto. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto.



El acta de constitución del proyecto establece una relación de colaboración entre la organización ejecutora y la organización solicitante. En el caso de proyectos externos generalmente se opta por establecer este acuerdo a través de un contrato formal. El acta de constitución de un proyecto puede utilizarse incluso para establecer acuerdos internos en el seno de una organización a fin de asegurar la entrega adecuada de acuerdo con el contrato. El proyecto se inicia formalmente con la aprobación del acta de constitución del proyecto.


Se selecciona y asigna un director del proyecto tan pronto como sea posible, preferiblemente durante la elaboración del acta de constitución del proyecto y siempre antes de comenzar la planificación.

El acta de constitución del proyecto puede ser desarrollada por el patrocinador o el director del proyecto en colaboración con la entidad iniciadora. Esta colaboración permite que el director del proyecto tenga una mejor comprensión del propósito, los objetivos y los beneficios esperados del proyecto. Este entendimiento favorecerá una asignación eficiente de los recursos a las actividades del proyecto.

El acta de constitución del proyecto confiere al director del proyecto la autoridad necesaria para planificar, ejecutar y controlar el proyecto. Los proyectos son iniciados por una entidad externa a los mismos, como un patrocinador, un programa o una oficina de dirección de proyectos (PMO), o el presidente de un órgano de gobierno del portafolio o un representante autorizado.

El iniciador del proyecto o patrocinador debería encontrarse en un nivel adecuado para obtener la financiación del proyecto y comprometer los recursos para el mismo. Los proyectos se inician como consecuencia de necesidades internas de la empresa o de influencias externas. Estas necesidades o influencias a menudo motivan la realización de un análisis de necesidades, un estudio de viabilidad, un caso de negocio o la descripción de la situación que abordará el proyecto. La elaboración del acta de constitución de un proyecto confirma la alineación del proyecto con la estrategia y el trabajo en curso de la organización.

El acta de constitución del proyecto no se considera un contrato porque no hay consideraciones, compromisos o intercambios monetarios en su creación.

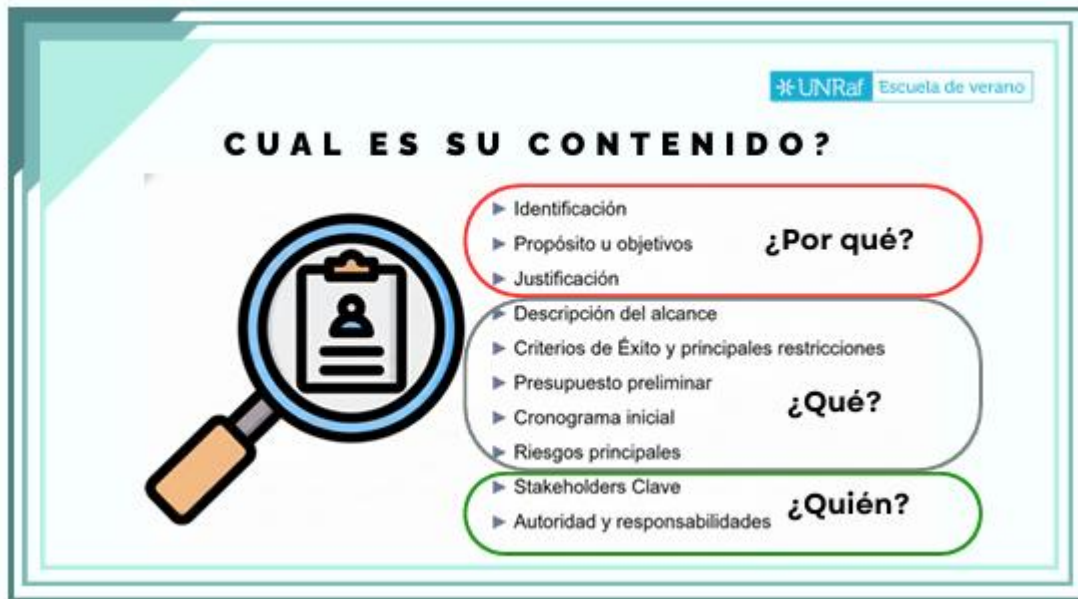

El Acta de Constitución del Proyecto es un documento emitido por el iniciador del proyecto o patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto.


Documenta la información de alto nivel acerca del proyecto y del producto, servicio o resultado que el proyecto pretende satisfacer, tal como:

- El propósito del proyecto
- Los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito asociados
- Los requisitos de alto nivel
- La descripción de alto nivel del proyecto, los límites y los entregables claves
- El riesgo general del proyecto
- El resumen del cronograma de hitos
- Los recursos financieros pre aprobados
- La lista de interesados clave
- Los requisitos de aprobación del proyecto (es decir, en qué consiste el éxito del proyecto, quién decide si el proyecto tiene éxito y quién firma la aprobación del proyecto)
- Los criterios de salida del proyecto (es decir, qué condiciones deben cumplirse a fin de cerrar o cancelar el proyecto o fase)
- El director del proyecto asignado, su responsabilidad y su nivel de autoridad
- El nombre y el nivel de autoridad del patrocinador o de quienes autorizan el acta de constitución del proyecto.

A un alto nivel, el acta de constitución del proyecto asegura una comprensión común por parte de los interesados de los entregables clave, los hitos y los roles y responsabilidades de todos los involucrados en el proyecto. Las restricciones y los supuestos estratégicos y operativos de alto nivel normalmente se identifican en el caso

de negocio antes de que el proyecto se inicie y se reflejan luego en el acta de constitución del proyecto. Los supuestos sobre actividades y tareas de menor nivel se generan a lo largo del proyecto, tal como definir las especificaciones técnicas, las estimaciones, el cronograma, los riesgos, etc.

El registro de supuestos se utiliza para registrar todos los supuestos y restricciones a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

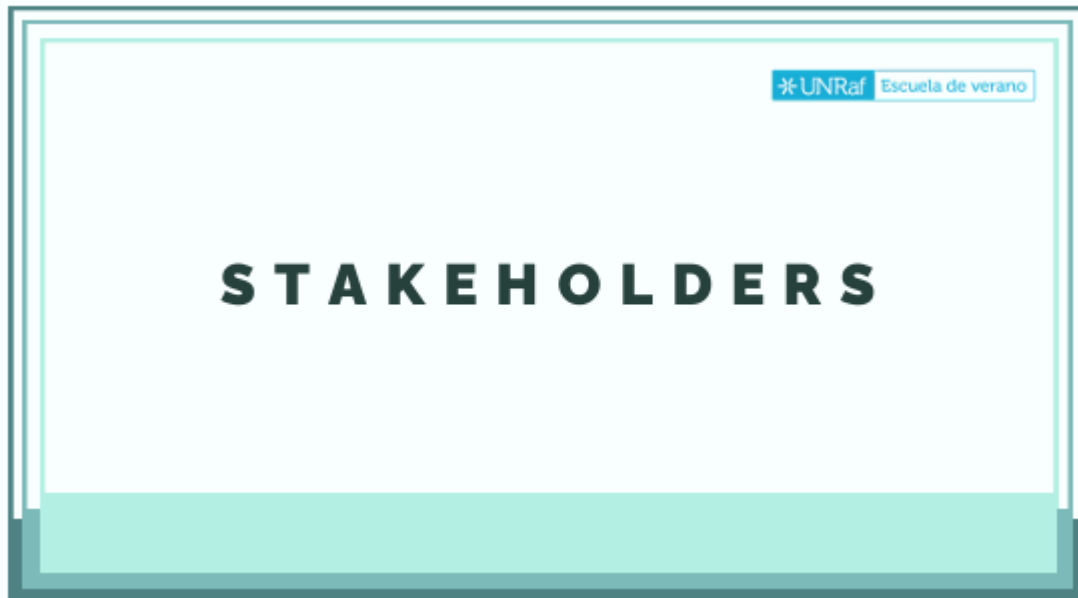


Capítulo 13 del PMBOK Gestión de los Interesados

- Stakeholders
- Procesos de gestión
- Entradas, herramientas y salidas


Escuela de verano

STAKEHOLDERS / INTERESADOS

- Participan activamente en el proyecto
-
- Sus intereses pueden verse afectados positiva o negativamente.



La **Gestión de los Interesados del Proyecto** incluye los procesos requeridos para:

1. identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto
2. para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto
3. para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto.

Los procesos apoyan el trabajo del equipo del proyecto para analizar las expectativas de los interesados, evaluar el grado en que afectan o son afectados por el proyecto, y desarrollar estrategias para involucrar de manera eficaz a los interesados en apoyo de las decisiones del proyecto y la planificación y ejecución del trabajo del proyecto.

La satisfacción de los interesados debería identificarse y gestionarse como uno de los objetivos del proyecto.

La clave para el involucramiento eficaz de los interesados es centrarse en la comunicación continua con todos los interesados, incluidos los miembros del equipo, para comprender sus necesidades y expectativas, abordar los incidentes en el momento en que ocurren, gestionar conflictos de intereses y fomentar un adecuado involucramiento de los interesados en las decisiones y actividades del proyecto.

El proceso de identificar e involucrar a los interesados en beneficio del proyecto es iterativo. Si bien los procesos de Gestión de los Interesados del Proyecto se describen una única vez, las actividades de identificación, priorización e involucramiento deberían revisarse y actualizarse periódicamente, y al menos en los siguientes momentos en que:

- El proyecto avanza a través de diferentes fases en su ciclo de vida
- Los interesados actuales ya no están involucrados en el trabajo del proyecto o los nuevos interesados se convierten en miembros de la comunidad de interesados del proyecto
- Existen cambios significativos en la organización o la comunidad de interesados en general.



Los **interesados del proyecto (stakeholders)** son todas las personas u organizaciones que pueden influir en el proyecto o verse afectadas por sus resultados. Identificarlos correctamente desde el inicio es clave para comprender sus expectativas, necesidades y niveles de influencia sobre el desarrollo del proyecto.

Entre los principales interesados se encuentran el sponsor, los clientes y usuarios, los proveedores, los gerentes funcionales y los socios de negocio, así como otros actores como la competencia u organismos gubernamentales. Cada uno tiene intereses distintos y puede impactar positiva o negativamente en el éxito del proyecto.

La gestión de los interesados busca involucrarlos de manera adecuada, comunicarse eficazmente y anticipar posibles conflictos o resistencias. Un buen manejo de los stakeholders permite al director del proyecto alinear expectativas, facilitar la toma de decisiones y aumentar las probabilidades de éxito del proyecto.



Identificar a los Interesados es el proceso de identificar periódicamente a los interesados del proyecto, así como de analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto.

El beneficio clave de este proceso es que permite al equipo del proyecto identificar el enfoque adecuado para el involucramiento de cada interesado o grupo de interesados. Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea necesario.



Análisis de interesados

El análisis de interesados da como resultado una lista de interesados e información relevante como sus cargos en la organización, roles en el proyecto, “intereses”, expectativas, actitudes (sus niveles de apoyo al proyecto) y su preocupación por la información relativa al proyecto.

En un sentido amplio, los intereses de los interesados pueden incluir, entre otros, una combinación de:

- **Interés.** Una persona o grupo puede verse afectado por una decisión relacionada con el proyecto o sus resultados.
- **Derechos** (derechos legales o morales). Los derechos legales, como la salud y seguridad en el trabajo, pueden estar definidos en el marco legislativo de un país. Los derechos morales pueden implicar conceptos de protección de sitios históricos o sostenibilidad ambiental.
- **Propiedad.** Una persona o grupo tiene un título legal de un activo o una propiedad.
- **Conocimiento.** Conocimiento especializado, que puede beneficiar al proyecto a través de una entrega más eficaz de objetivos del proyecto, resultados de la organización o conocimiento de las estructuras de poder de la organización.
- **Contribución.** Provisión de fondos u otros recursos, incluidos recursos humanos, o 5 prestación de apoyo para el proyecto de formas más intangibles, como el respaldo para promover los objetivos del proyecto o actuar como amortiguador entre el proyecto y las estructuras de poder de la organización y su política.



Identificar a los Interesados: Entradas

1. **Acta de Constitución del Proyecto:** identifica la lista de interesados clave. También puede contener información sobre las responsabilidades de los interesados.
2. **Documentos de Negocio:** En la primera iteración del proceso Identificar a los Interesados, el caso de negocio y el plan de gestión de beneficios son fuentes de información acerca de los interesados del proyecto.
3. **Plan para la dirección del proyecto:** El plan para la dirección del proyecto no está disponible durante la identificación inicial de los interesados; sin embargo, una vez desarrollado, los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros: Plan de gestión de las comunicaciones y Plan de involucramiento de los interesados.
4. **Documentos del proyecto:** Es poco probable que los documentos del proyecto sean una entrada para la identificación inicial de los interesados. Sin embargo, la identificación de interesados ocurre a lo largo de todo el proyecto. Una vez superada la fase inicial del proyecto, habrá más documentos disponibles que se utilizan a lo largo del proyecto. (Ej. Registro de requisitos / registro de incidentes, etc).
5. **Acuerdos:** Las partes de un acuerdo son interesados del proyecto. El acuerdo puede contener referencias a otros interesados.
6. **Factores ambientales de la empresa**
7. **Activos de los procesos de la organización**



Juicio de Expertos

Se debe tomar en cuenta la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos especializados o capacitación en los siguientes temas:

- Comprensión de la política y las estructuras de poder de la organización
- Conocimiento del entorno y la cultura de la organización y otras organizaciones afectadas, incluidos clientes y el entorno en general
- Conocimiento de la industria o el tipo de entregable del proyecto
- Conocimiento de las contribuciones y la pericia de los miembros individuales del equipo.

Recopilación de datos

Se pueden realizar técnicas de recopilación de datos mediante: Cuestionarios, encuestas y tormenta de ideas, entre otras.

Análisis de datos

Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras:

- Análisis de interesados. El análisis de interesados da como resultado una lista de interesados e información relevante como sus cargos en la organización, roles en el proyecto, "intereses", expectativas, actitudes (sus niveles de apoyo al proyecto) y su preocupación por la información relativa al proyecto. En un sentido amplio, los intereses de los interesados pueden incluir, entre otros, una combinación de:
 - Interés.
 - Derechos (derechos legales o morales).
 - Propiedad.

- Conocimiento.
- Contribución.
- Análisis de documentos: Evaluación de la documentación disponible del proyecto y las lecciones aprendidas de proyectos anteriores para identificar a los interesados y otra información complementaria.


Representación de datos

Existen varias herramientas para la representación de datos, entre ellas se encuentra el mapeo/representación de interesados.

- Matriz de poder/interés, matriz de poder/influencia o matriz de impacto/influencia
- Cubo de interesados
- Modelo de Prominencia
- Dirección de la influencia
- Priorización


Reuniones

Las reuniones se utilizan para desarrollar un entendimiento sobre los interesados significativos del proyecto. Pueden adoptar la forma de talleres de facilitación, discusiones guiadas en grupos pequeños, y grupos virtuales que utilizan tecnología electrónica o de medios sociales para compartir ideas y analizar datos.

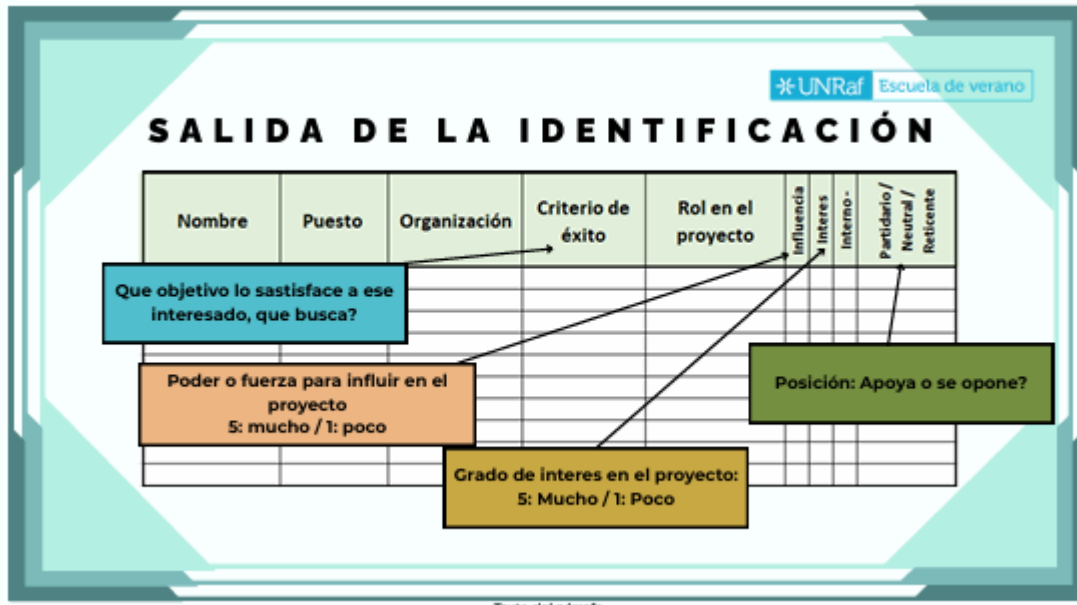

La principal salida del proceso Identificar a los Interesados es el registro de interesados. Este documento contiene información acerca de los interesados identificados e incluye, entre otras cosas:


- **Información de identificación:** Nombre, puesto en la organización, ubicación y datos de contacto, y rol en el proyecto.
- **Información de evaluación:** Requisitos principales, expectativas, potencial para influir en los resultados del proyecto, y la fase del ciclo de vida del proyecto en la que el interesado tiene la mayor influencia o impacto.
- **Clasificación de los interesados:** Interno/externo, impacto/influencia/poder/interés, ascendente/descendente/ hacia afuera/lateral, o cualquier otro modelo de clasificación elegido por el director del proyecto.

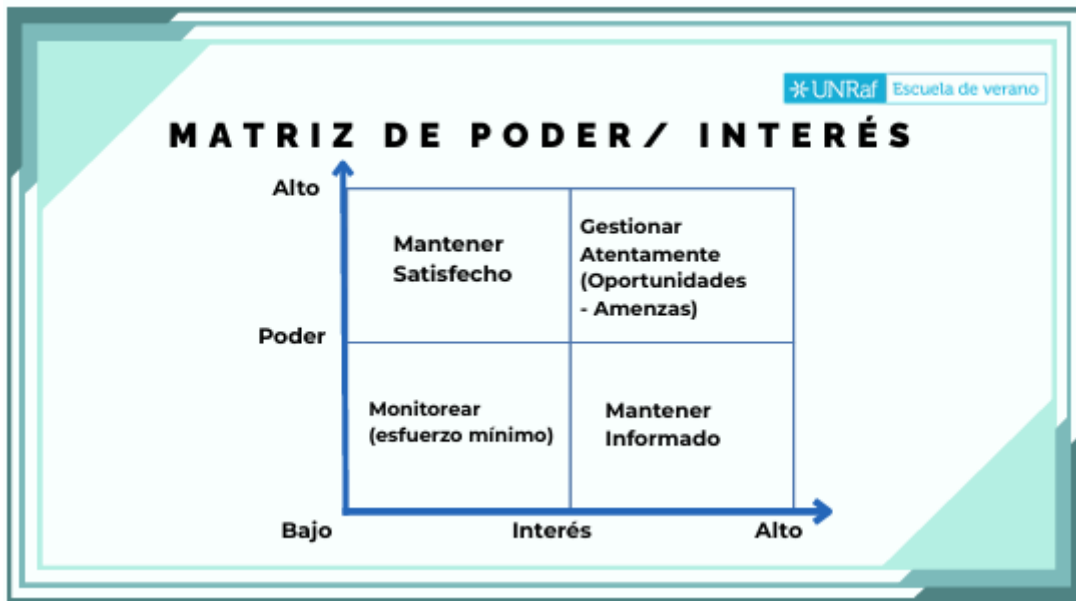

La **matriz de poder / interés** es una herramienta que permite clasificar a los interesados del proyecto según el nivel de poder que tienen para influir en el proyecto y el interés que presentan sobre sus resultados. Su objetivo principal es definir la estrategia de gestión y comunicación más adecuada para cada grupo de stakeholders.

Los interesados con alto poder y alto interés requieren una gestión cercana y continua, ya que pueden generar tanto oportunidades como amenazas para el proyecto. En estos casos, es fundamental involucrarlos en las decisiones clave y mantenerlos informados de los avances y cambios relevantes. Por otro lado, aquellos con alto poder y bajo interés deben ser mantenidos satisfechos, cuidando la relación sin sobrecargarlos de información innecesaria.


Los interesados con bajo poder y alto interés necesitan ser mantenidos informados, ya que suelen estar directamente afectados por el proyecto aunque no tengan capacidad de decisión. Finalmente, los interesados con bajo poder y bajo interés solo requieren un monitoreo básico, realizando el mínimo esfuerzo necesario para asegurar que no se conviertan en un riesgo futuro para el proyecto.

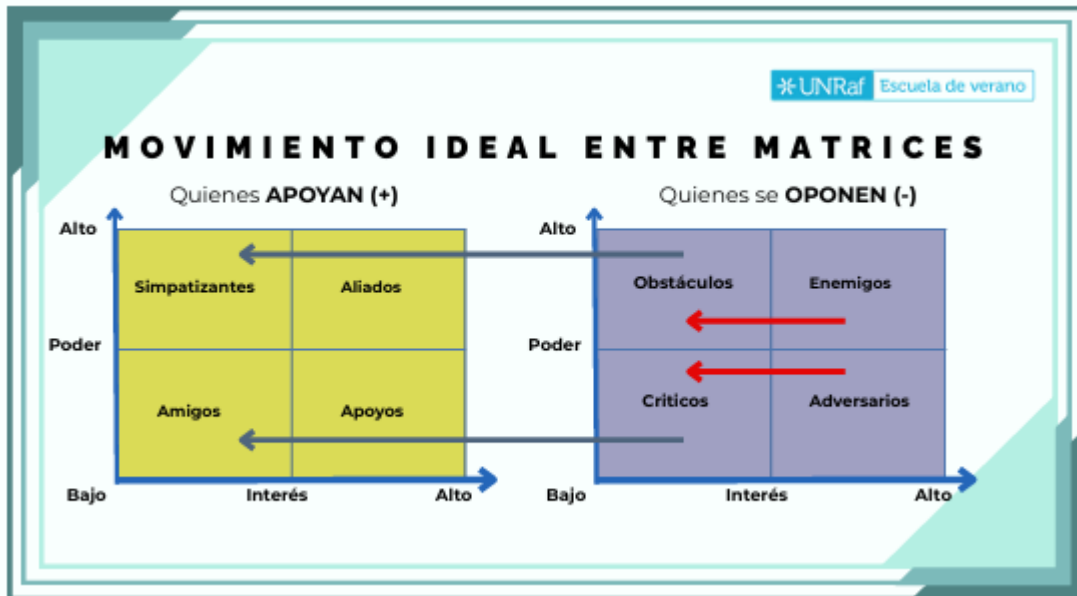

Este esquema muestra el **movimiento ideal de los interesados entre matrices**, diferenciando a quienes apoyan el proyecto de quienes se oponen. El objetivo de la gestión de stakeholders no es solo identificarlos, sino influir activamente en su posicionamiento, buscando maximizar apoyos y reducir resistencias a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

En el caso de los interesados que apoyan, la estrategia consiste en fortalecer su compromiso, intentando moverlos hacia cuadrantes de mayor interés y mayor poder, transformando simpatizantes en aliados y aliados en apoyos clave del proyecto. Esto se logra mediante una comunicación efectiva, participación en decisiones relevantes y alineación con los beneficios del proyecto.

Para los interesados que se oponen, el enfoque no siempre es convertirlos en aliados, sino reducir su nivel de oposición o su influencia negativa. A través del diálogo, la gestión de expectativas y la negociación, se busca desplazar a los opositores hacia zonas de menor poder o menor interés, disminuyendo así los riesgos y facilitando la ejecución del proyecto.

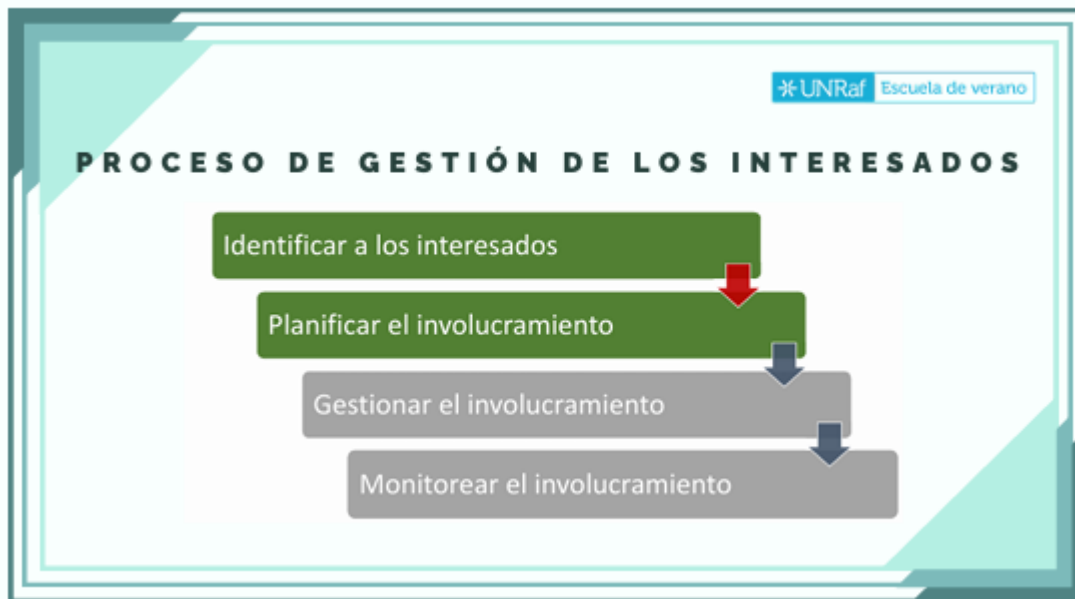


Planificar el Involucramiento de los Interesados es el proceso de desarrollar enfoques para involucrar a los interesados del proyecto, con base en sus necesidades, expectativas, intereses y el posible impacto en el proyecto. El beneficio clave es que proporciona un plan factible para interactuar de manera eficaz con los interesados.

Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea necesario.

Temprano en el ciclo de vida del proyecto se desarrolla un plan eficaz que reconoce las diversas necesidades de información de los interesados del proyecto; este plan se revisa y se actualiza periódicamente a medida que cambia la comunidad de interesados. Es iterativo.

Las situaciones disparadoras típicas que requieren actualizaciones del plan incluyen, entre otras:

- Cuando comienza una nueva fase del proyecto.
- Cuando existen cambios en la estructura de la organización o dentro de la industria
- Cuando nuevos individuos o grupos se transforman en interesados, los interesados actuales ya no forman parte de la comunidad de interesados o la importancia de determinados interesados para el éxito del proyecto cambia.
- Cuando las salidas de otras áreas de procesos del proyecto, tales como la gestión de cambios, la gestión de riesgos o la gestión de incidentes, requieren una revisión de las estrategias de involucramiento de los interesados.

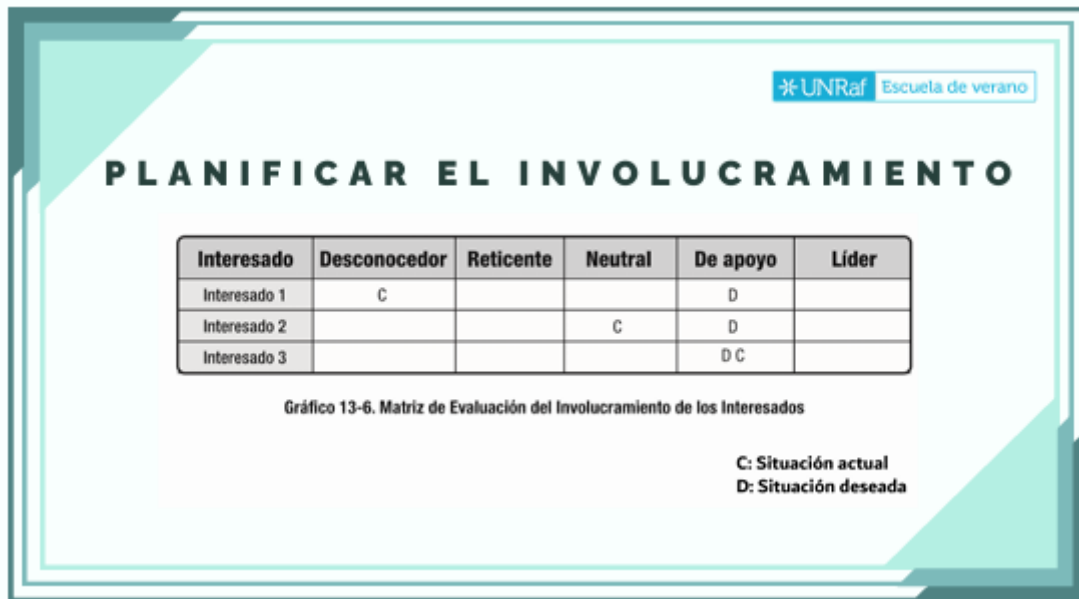


Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados

La matriz de evaluación del involucramiento de los interesados permite comparar los niveles actuales de participación de los interesados con los niveles deseados de participación necesarios para la entrega exitosa del proyecto.

El Gráfico 13-6 muestra una forma de clasificar el nivel de participación de los interesados. El nivel de participación de los interesados puede clasificarse de la siguiente manera:

- **Desconocedor:** Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales.
- **Reticente:** Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales pero reticente a cualquier cambio que pueda ocurrir como consecuencia del trabajo o los resultados del proyecto. Estos interesados no prestarán apoyo al trabajo o los resultados del proyecto.
- **Neutral:** Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni lo deja de apoyar.
- **De apoyo:** Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales; apoya el trabajo y sus resultados.
- **Líder:** Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente involucrado en asegurar el éxito del mismo.

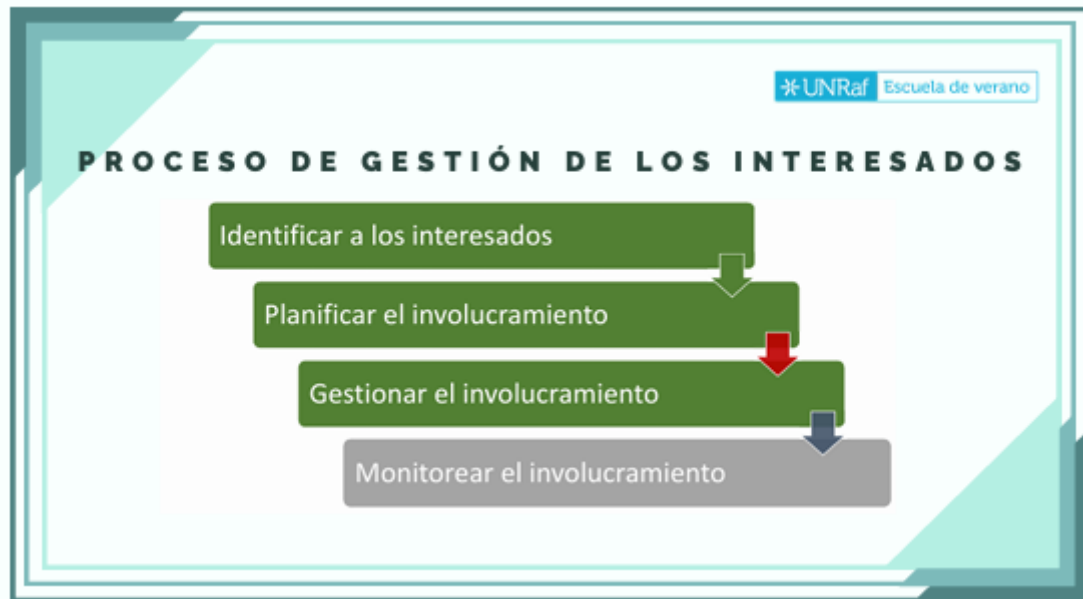

Gestionar el Involucramiento de los Interesados es el proceso de comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer sus necesidades y expectativas, abordar los incidentes y fomentar la participación adecuada de los interesados.

El beneficio clave de este proceso es que permite al director del proyecto incrementar el apoyo y minimizar la resistencia por parte de los interesados.

Gestionar el Involucramiento de los Interesados implica realizar actividades tales como:

- Involucrar a los interesados en las etapas adecuadas del proyecto para obtener, confirmar o mantener su compromiso continuo con el éxito del mismo.
- Gestionar las expectativas de los interesados mediante negociación y comunicación.
- Abordar riesgos o posibles inquietudes relacionados con la gestión de los interesados y anticipar futuros incidentes que puedan plantear los interesados.
- Aclarar y resolver los incidentes que han sido identificados.



Habilidades de Comunicación

Participa Los métodos de comunicación identificados para cada interesado en el plan de gestión de las comunicaciones se aplican durante la gestión del involucramiento de los interesados. El equipo de dirección del proyecto utiliza la retroalimentación para ayudar a comprender la reacción de los interesados frente a las diversas actividades de dirección del proyecto y decisiones clave. La retroalimentación se puede recoger, por ejemplo, de las siguientes maneras:


- Conversaciones, tanto formales como informales
- Identificación y discusión de incidentes
- Reuniones
- Informes del avance
- Encuestas.

Habilidades interpersonales y de equipo

Las habilidades interpersonales y de equipo que pueden utilizarse en este proceso incluyen, entre otras:

- **Gestión de conflictos:** El director del proyecto debe garantizar que los conflictos se resuelvan de manera oportuna.
- **Conciencia cultural:** La conciencia cultural se utiliza para ayudar al director y al 27 equipo del proyecto a comunicarse de manera eficaz teniendo en cuenta las diferencias culturales y los requisitos de los interesados.
- **Negociación:** La negociación se utiliza para conseguir apoyo o un acuerdo que respalde el trabajo del proyecto o sus resultados y para resolver conflictos dentro del equipo o con otros interesados.

- **Observación/conversación:** La observación/conversación se utiliza para mantenerse en contacto con el trabajo y las actitudes de los miembros del equipo del proyecto y otros interesados.
- **Conciencia política:** La conciencia política se logra a través de la comprensión de las relaciones de poder dentro y en torno al proyecto.

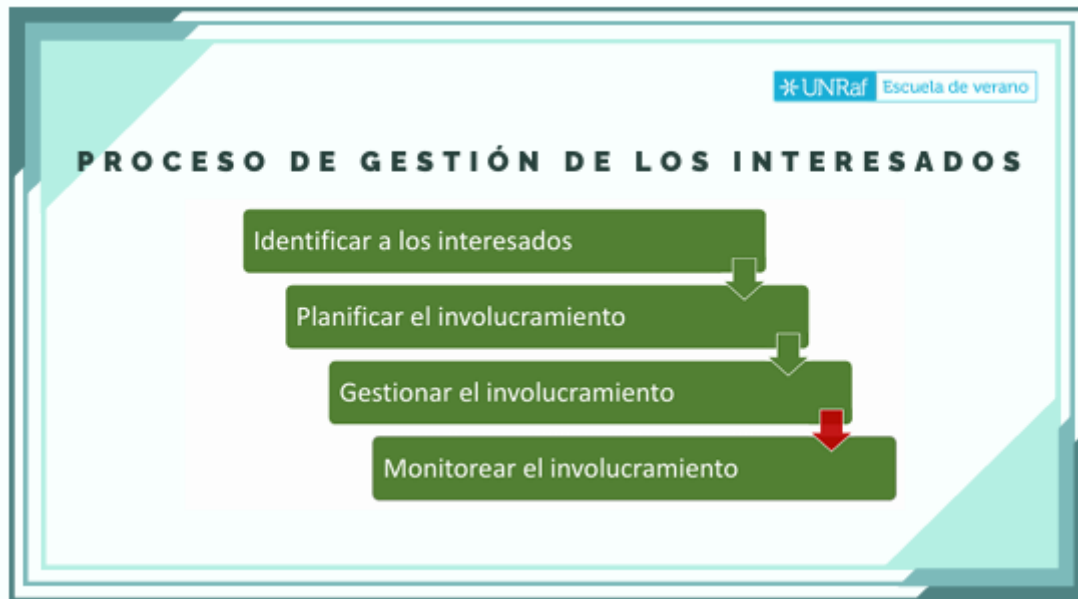

Monitorear el Involucramiento de los Interesados es el proceso de monitorear las relaciones de los interesados del proyecto y adaptar las estrategias para involucrar a los interesados a través de la modificación de las estrategias y los planes de involucramiento.

El beneficio clave de este proceso es que se mantiene o incrementa la eficiencia y la eficacia de las actividades de participación de los interesados a medida que el proyecto evoluciona y su entorno cambia.



Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto.

Como salidas de este proceso se pueden encontrar:

- **Información de desempeño del trabajo:** que incluye información sobre el estado de involucramiento de los interesados (ej. nivel de apoyo actual comparado con el nivel deseado)
- **Actualización del plan para la dirección del proyecto:** Puede surgir una necesidad de realizar un cambio en COMO gestionar los recursos, las comunicaciones o a los interesados, todo esto implica cambiar los planes referidos (Plan de recursos, plan de comunicaciones, plan de interesados)
