

# GESTIÓN DE PROYECTOS

Clase 3



**ALCANCE**

# DEFINICIÓN DE ALCANCE

Todo aquello que se **DEBE HACER** para cumplir con el objetivo del proyecto

**y solo aquello que se debe hacer**

# PRODUCTO VS PROYECTO

## Alcance Producto

Características y funciones de un producto, servicio o resultado esperado

## Alcance Proyecto

Trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado esperado con las funciones y características definidas



El Código Enigma Trailer Oficial Subtitulado



Copy link



Watch on  YouTube



# ¿ CUAL ES EL ALCANCE DEL PROYECTO DE TURING?



- ¿Cual es la necesidad que da origen al proyecto?

- ¿Cuales son los objetivos del proyecto?

- ¿Cuales son los entregables del proyecto?

- ¿Cuando termina el proyecto?



# PROYECTOS PREDICTIVOS Y ADAPTATIVO

## PREDICTIVOS

ORIENTADOS AL PLAN

## ADAPTATIVOS

ORIENTADOS AL CAMBIO



# PROCESOS DE GESTIÓN DEL ALCANCE


- Planificar la gestión del alcance
- Recopilar los requisitos
- Definir el alcance
- Crear la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)
- Validar el alcance
- Controlar el alcance




# PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE

# PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE

**CÓMO**



Será definido  
Será desarrollado  
Será moniotreado  
Será controlado  
Será validado

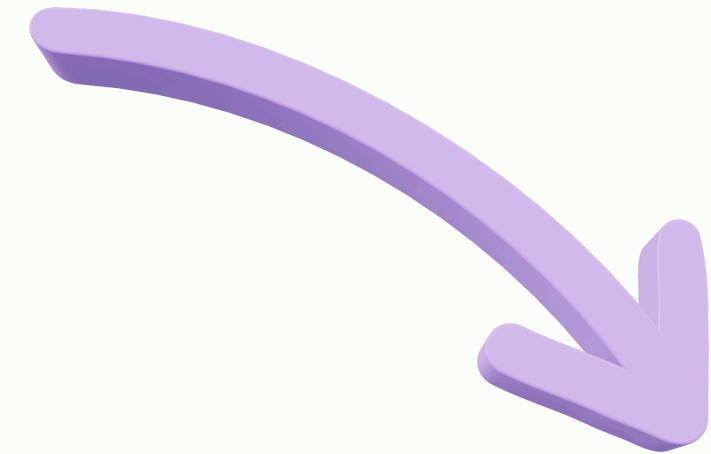

**EL ALCANCE**

# RECOPILAR LOS REQUISITOS

# RECOPILAR LOS REQUISITOS

**“Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto”.**


**Beneficio clave:** proporciona la base para definir el alcance del producto y el alcance del proyecto.

¿CUANTO MÁS CUESTA  
SOLUCIONAR UN  
PROBLEMA O SERVICIO  
UNA VEZ ENTREGADO AL  
CLIENTE, CONSIDERANDO  
QUE SOLUCIONARLO EN  
LA RECOPILOACIÓN DE  
REQUISITOS CUESTA 1?






# COSTO DE LA SOLUCIÓN DE UN PROBLEMA

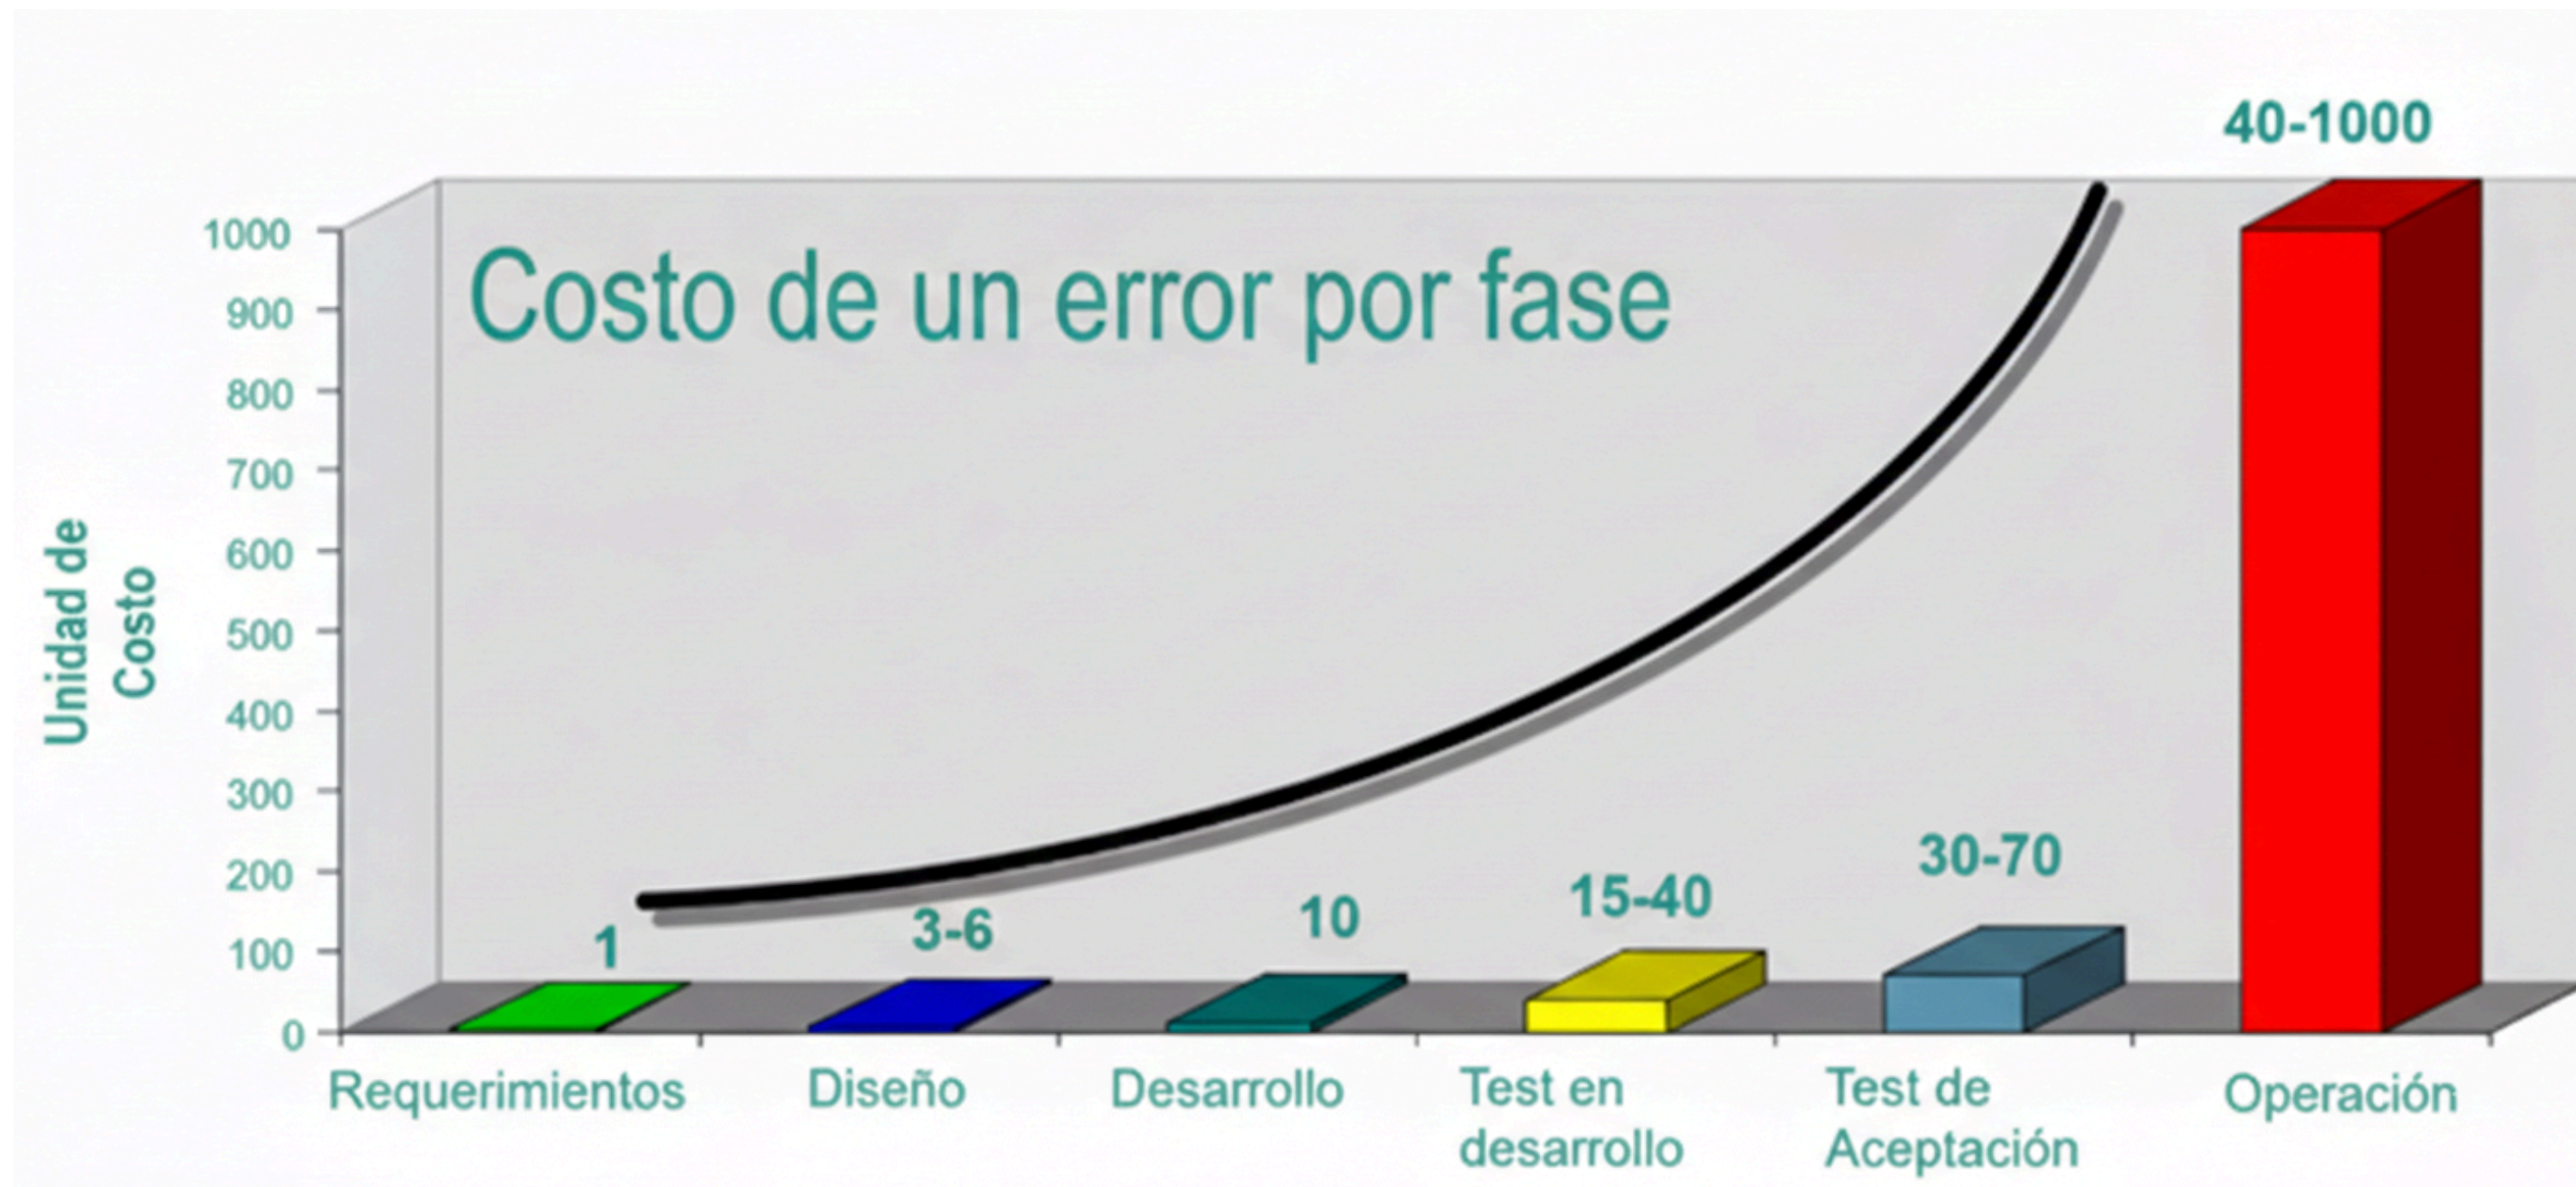



# ¿QUE ES UN ELEFANTE?

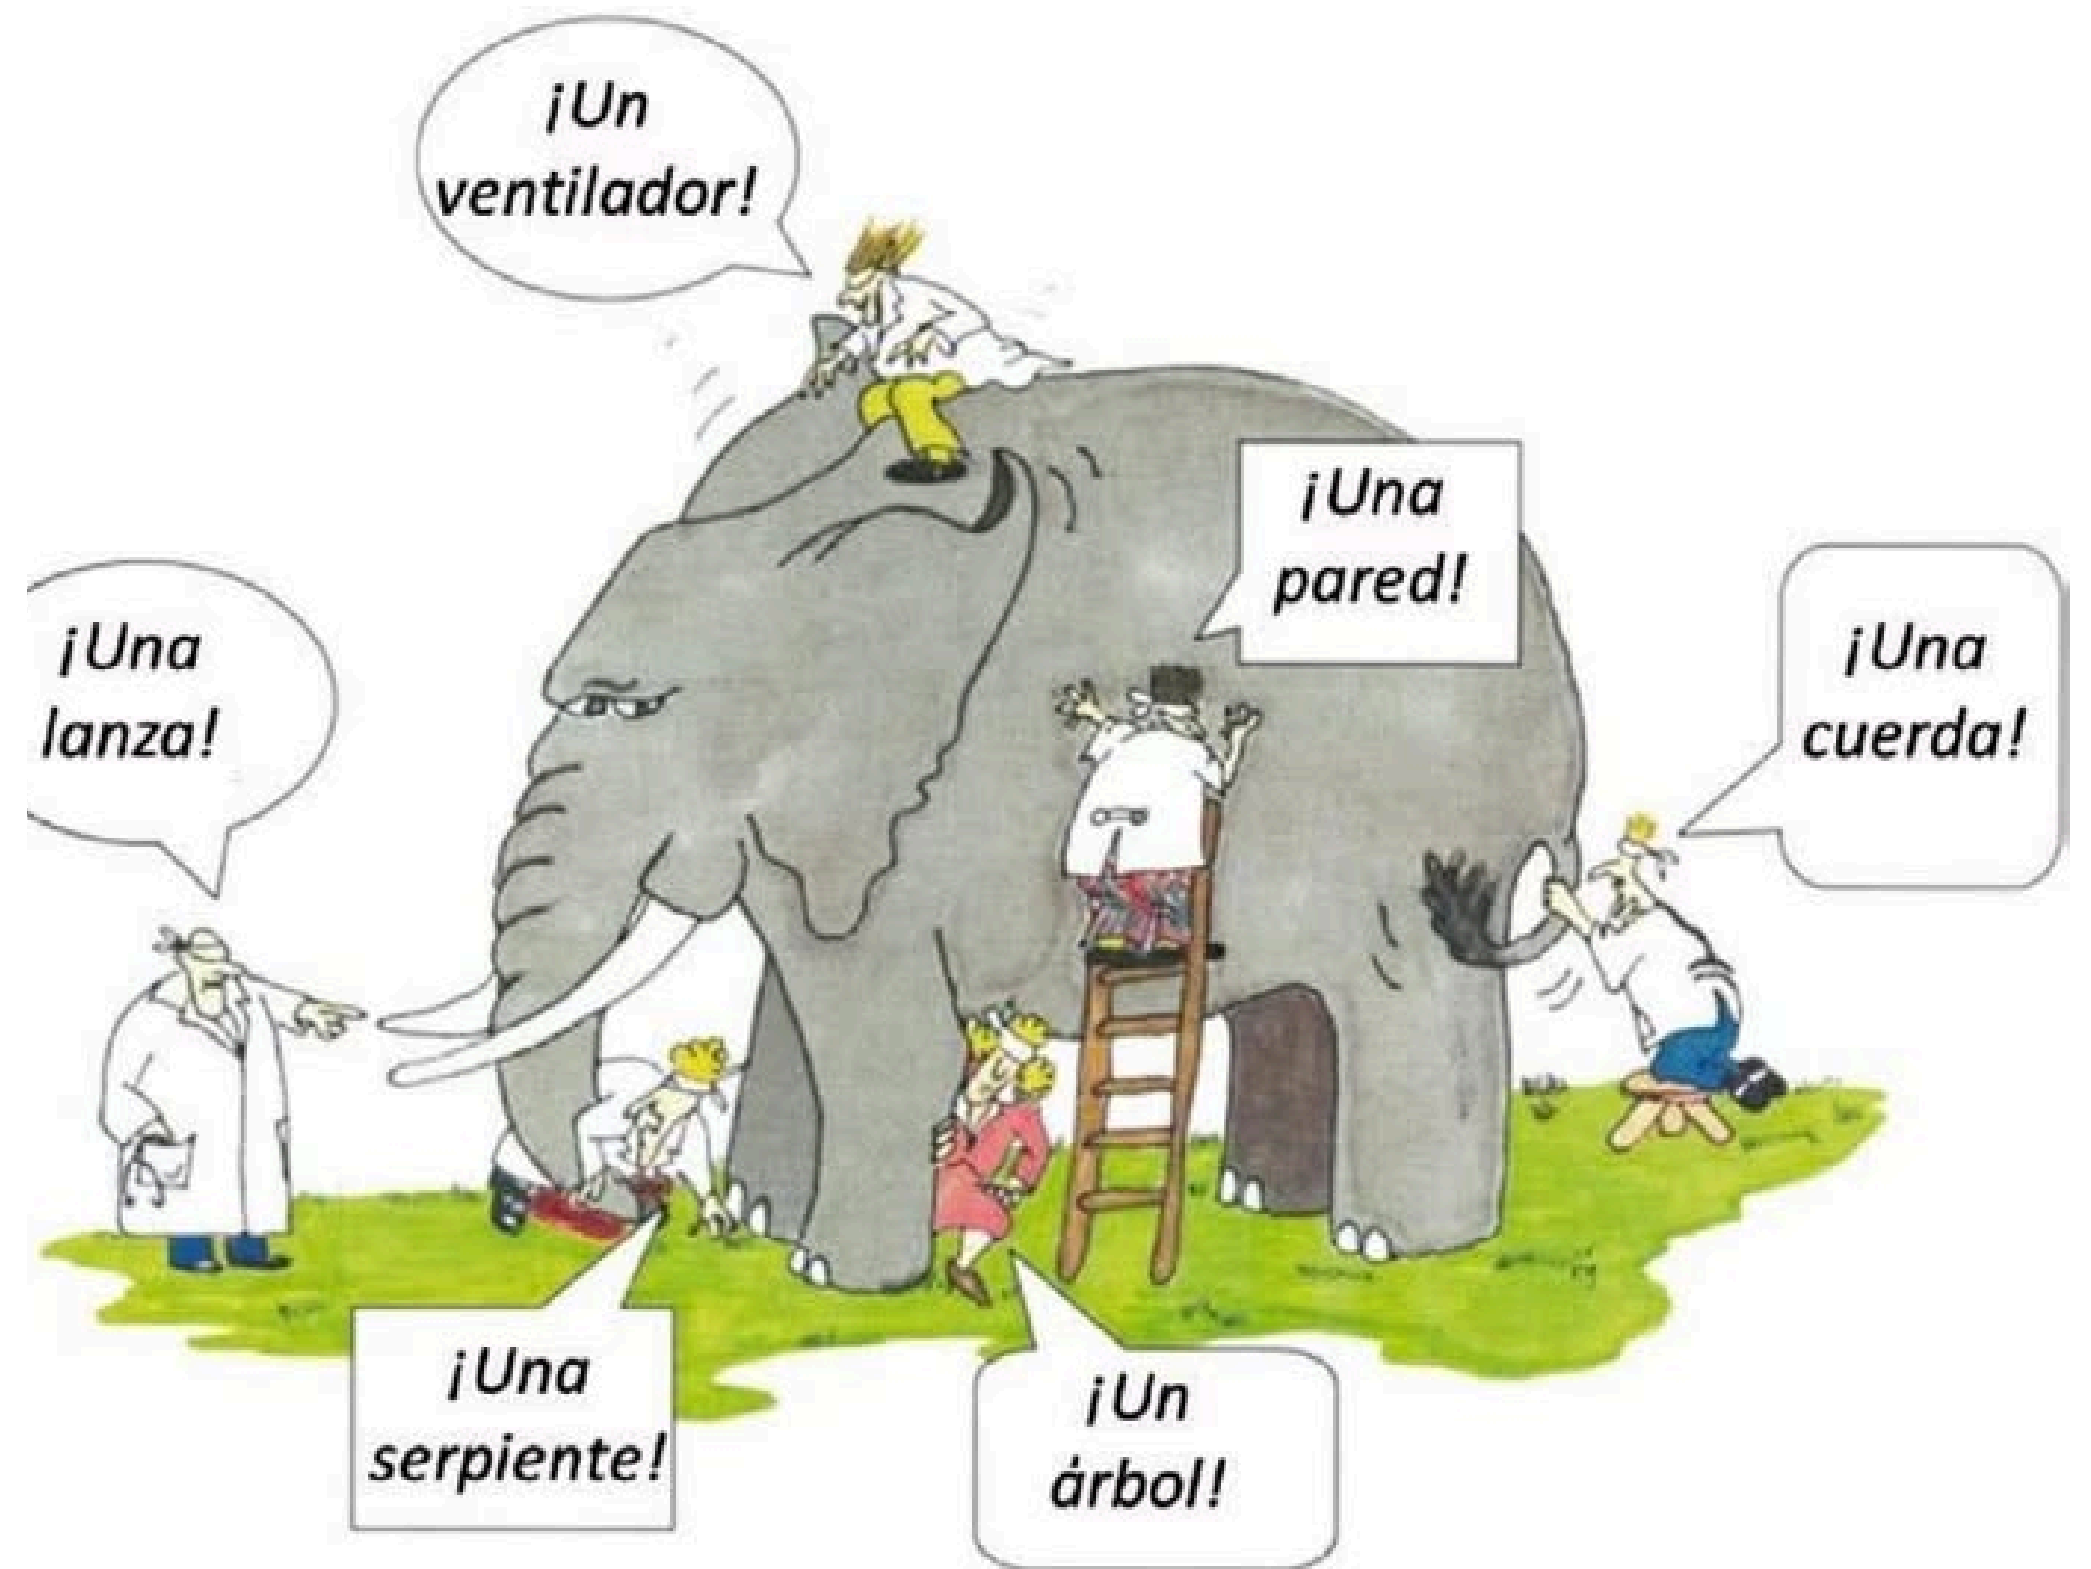

# RECOPILAR REQUISITOS

El éxito del proyecto depende directamente de la participación activa de los **interesados** en la identificación y descomposición de las necesidades en requisitos del proyecto y del producto, así como del cuidado al determinar, documentar y gestionar los requisitos del producto, servicio o resultado del proyecto.



# TIPOS DE REQUISITOS

## De Negocios

Necesidades de alto nivel de la organización.

## De los Interesados

Necesidades de un interesado o de un grupo de interesados

## De las Soluciones

Describen las prestaciones, funciones y características del producto, servicio o resultado que cumplirán los requisitos del negocio y de los interesados.

## De Transición y Preparación

Describen capacidades temporales necesarias para pasar del estado actual ("cómo es") al estado futuro deseado.

## Del Proyecto

Describen las acciones, los procesos u otras condiciones que el proyecto debe cumplir.

## De Calidad

Recolectan las condiciones o criterios necesarios para validar la finalización exitosa de un entregable del proyecto o el cumplimiento de otros requisitos del proyecto.

# TÉCNICA DE PRIORIZACIÓN MOSCOW



# Matriz de trazabilidad de Requerimientos

| Nombre de proyecto       |             |                              |                                                |                       |                |                    |                         |                |
|--------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| Centro de Costo          |             |                              |                                                |                       |                |                    |                         |                |
| Descripción del proyecto |             |                              |                                                |                       |                |                    |                         |                |
| ID                       | ID asociado | Descripción de requerimiento | Necesidad del negocio<br>Oportunidad, objetivo | Objetivo del proyecto | Entregable WBS | Diseño de producto | Desarrollo del producto | Caso de prueba |
| 01.                      | 01.01       |                              |                                                |                       |                |                    |                         |                |
|                          | 01.02       |                              |                                                |                       |                |                    |                         |                |
|                          | 01.03       |                              |                                                |                       |                |                    |                         |                |
| 02.                      | 02.01       |                              |                                                |                       |                |                    |                         |                |
|                          | 02.02       |                              |                                                |                       |                |                    |                         |                |
|                          | 02.03       |                              |                                                |                       |                |                    |                         |                |
|                          | 02.04       |                              |                                                |                       |                |                    |                         |                |
| 03.                      | 03.01       |                              |                                                |                       |                |                    |                         |                |
|                          | 03.02       |                              |                                                |                       |                |                    |                         |                |
|                          | 03.03       |                              |                                                |                       |                |                    |                         |                |
|                          | 03.04       |                              |                                                |                       |                |                    |                         |                |
|                          | 03.05       |                              |                                                |                       |                |                    |                         |                |



# DEFINIR EL ALCANCE

# DEFINIR EL ALCANCE

**“Es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto “**

Beneficio Clave: Describe los límites del producto, servicio o resultado mediante la especificación de cuáles de los requisitos serán incluidos y cuales excluidos.



# ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO



**Descripción del alcance del proyecto (elaborado Progresivamente)**



**Entregables del proyecto**



**Criterios de Aceptación**



**Exclusiones del proyecto**

# SMART





# PROCESOS DE GESTIÓN DEL ALCANCE


- Planificar la gestión del alcance
- Recopilar los requisitos
- Definir el alcance
- **Crear la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)**
- Validar el alcance
- Controlar el alcance



# ESTRUCTURA DETALLADA DEL TRABAJO

# DEFINICIÓN DE EDT

Puede tomar diferentes forma pero siempre es un desglose jerarquico que contiene las tareas a realizar




Cada nivel descendiente implica una profundización en el detalle de un componente del entregable del proyecto



No se registra ni tiempo ni costo en la EDT



# EDT

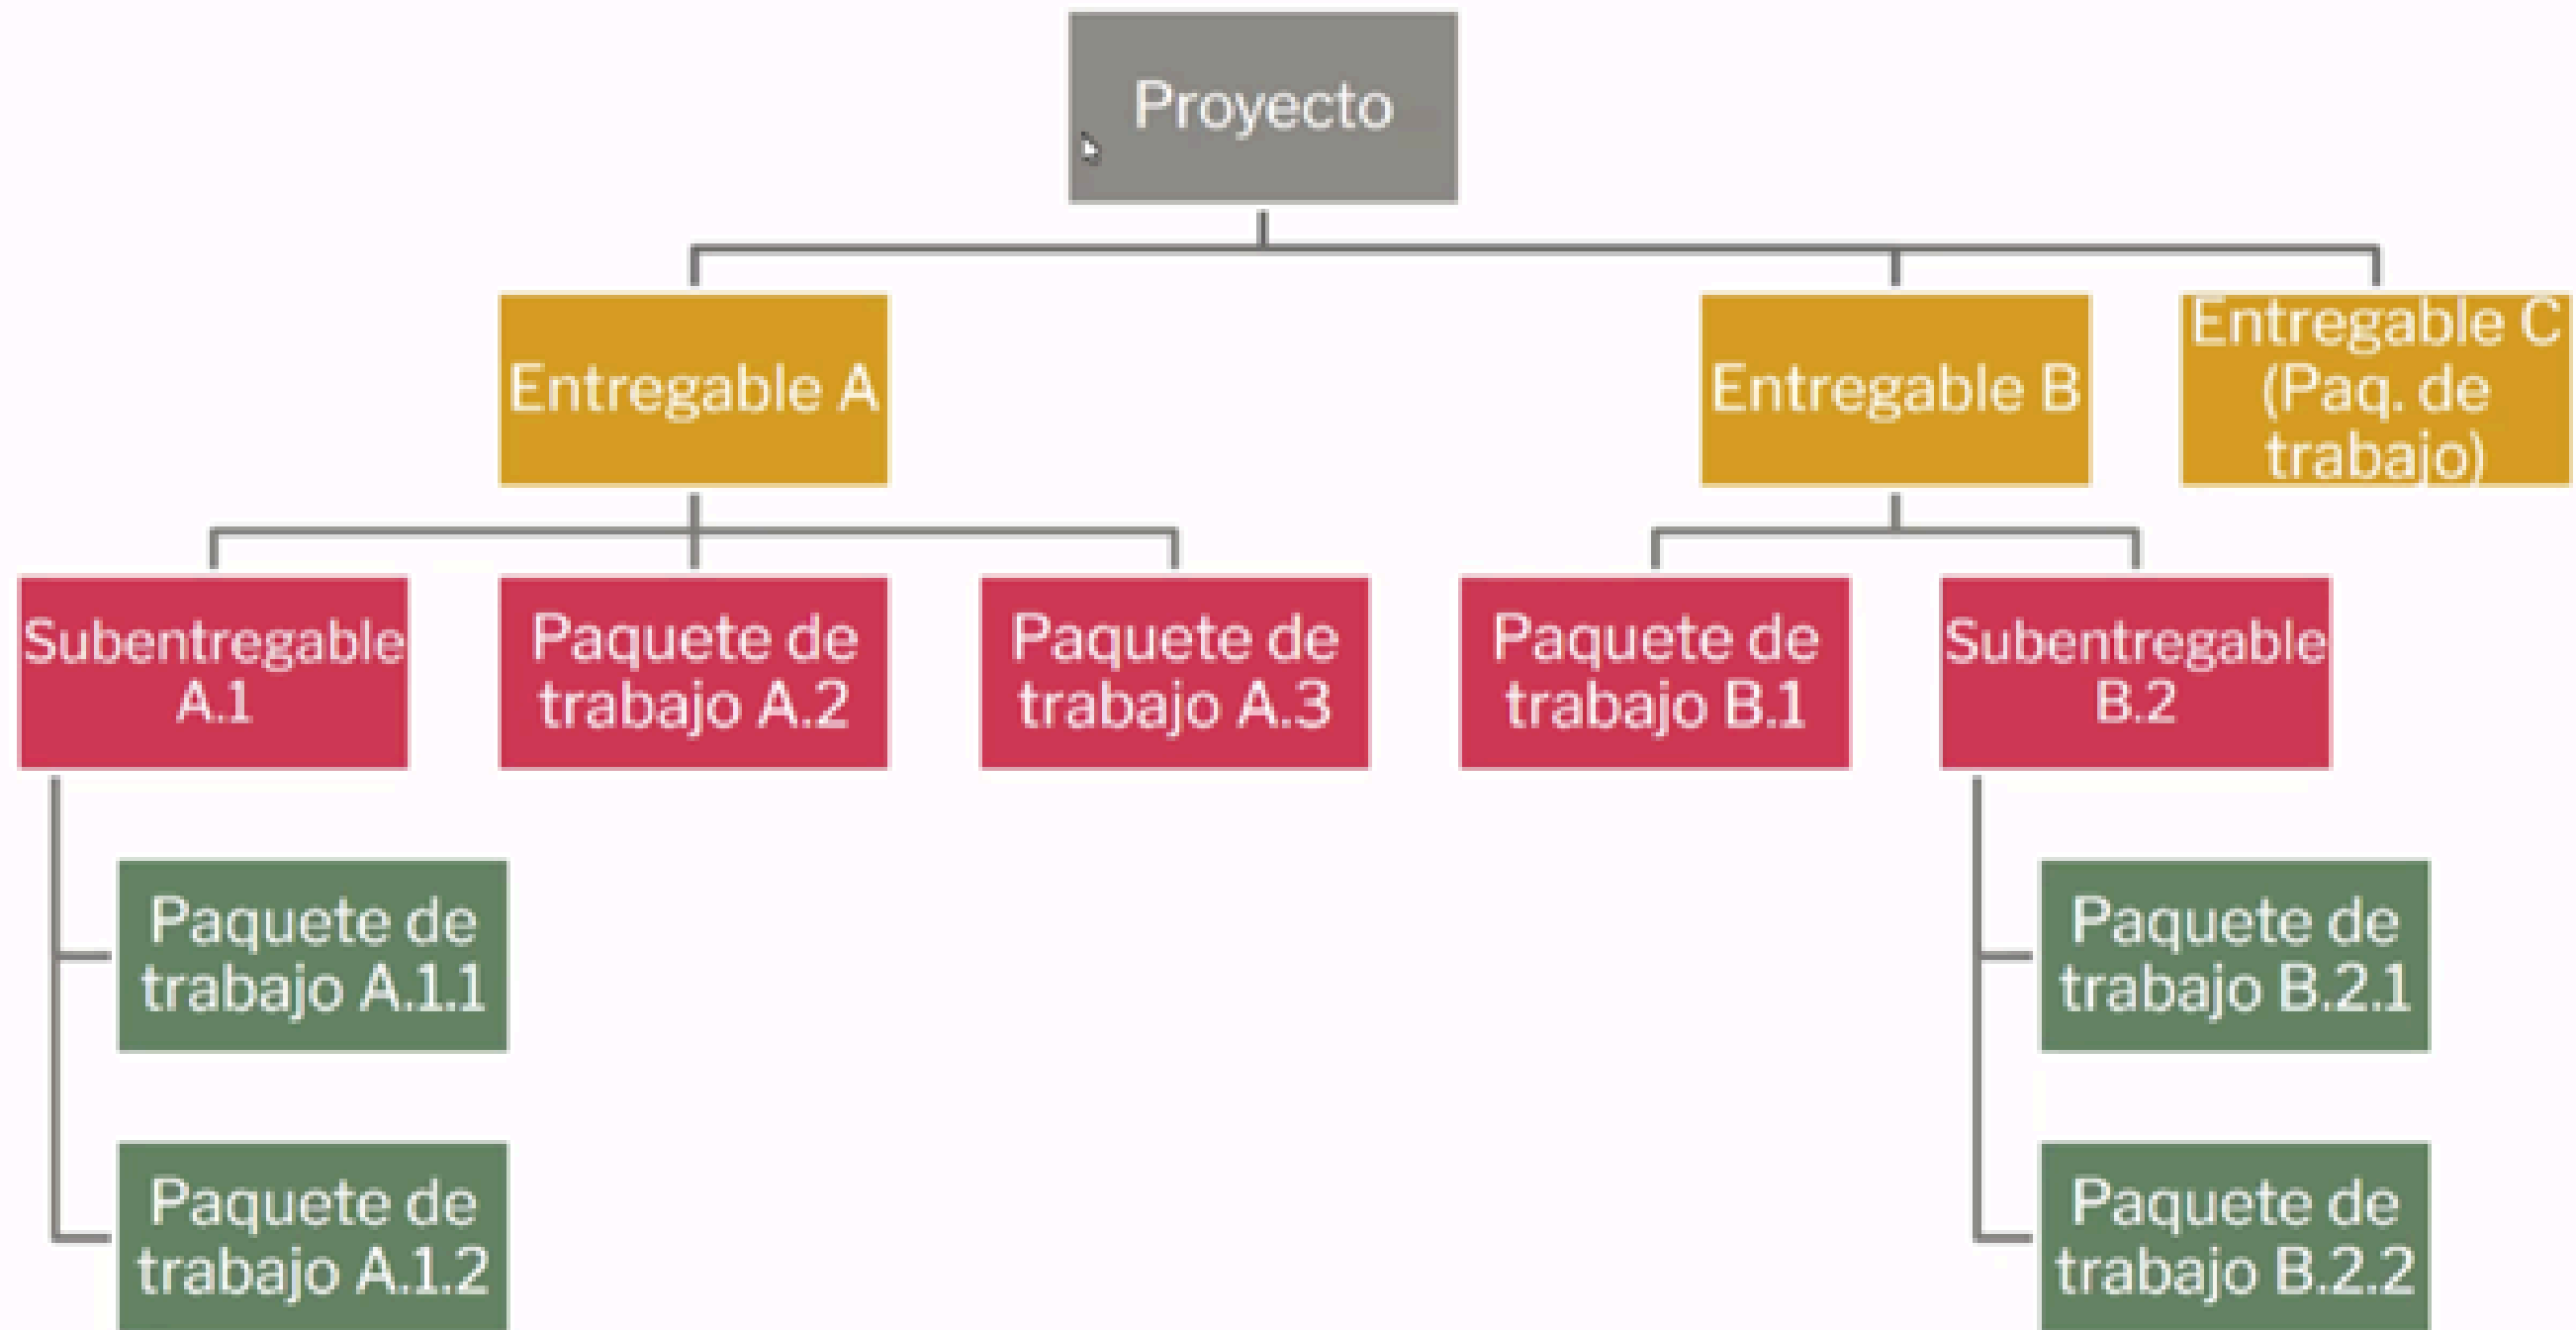

## ¿Qué EDT elegirías?

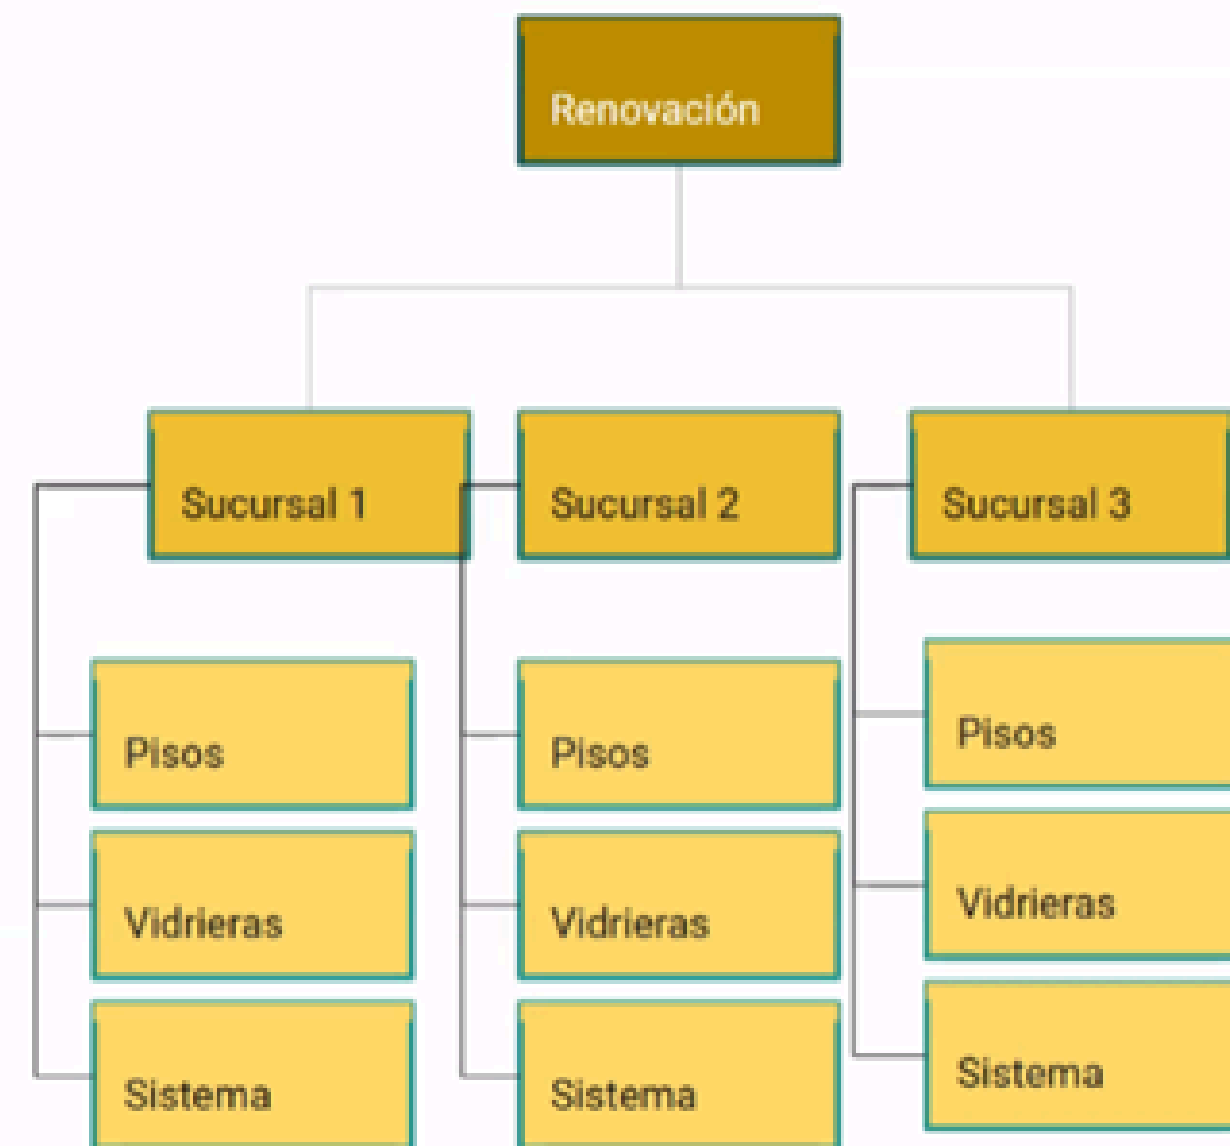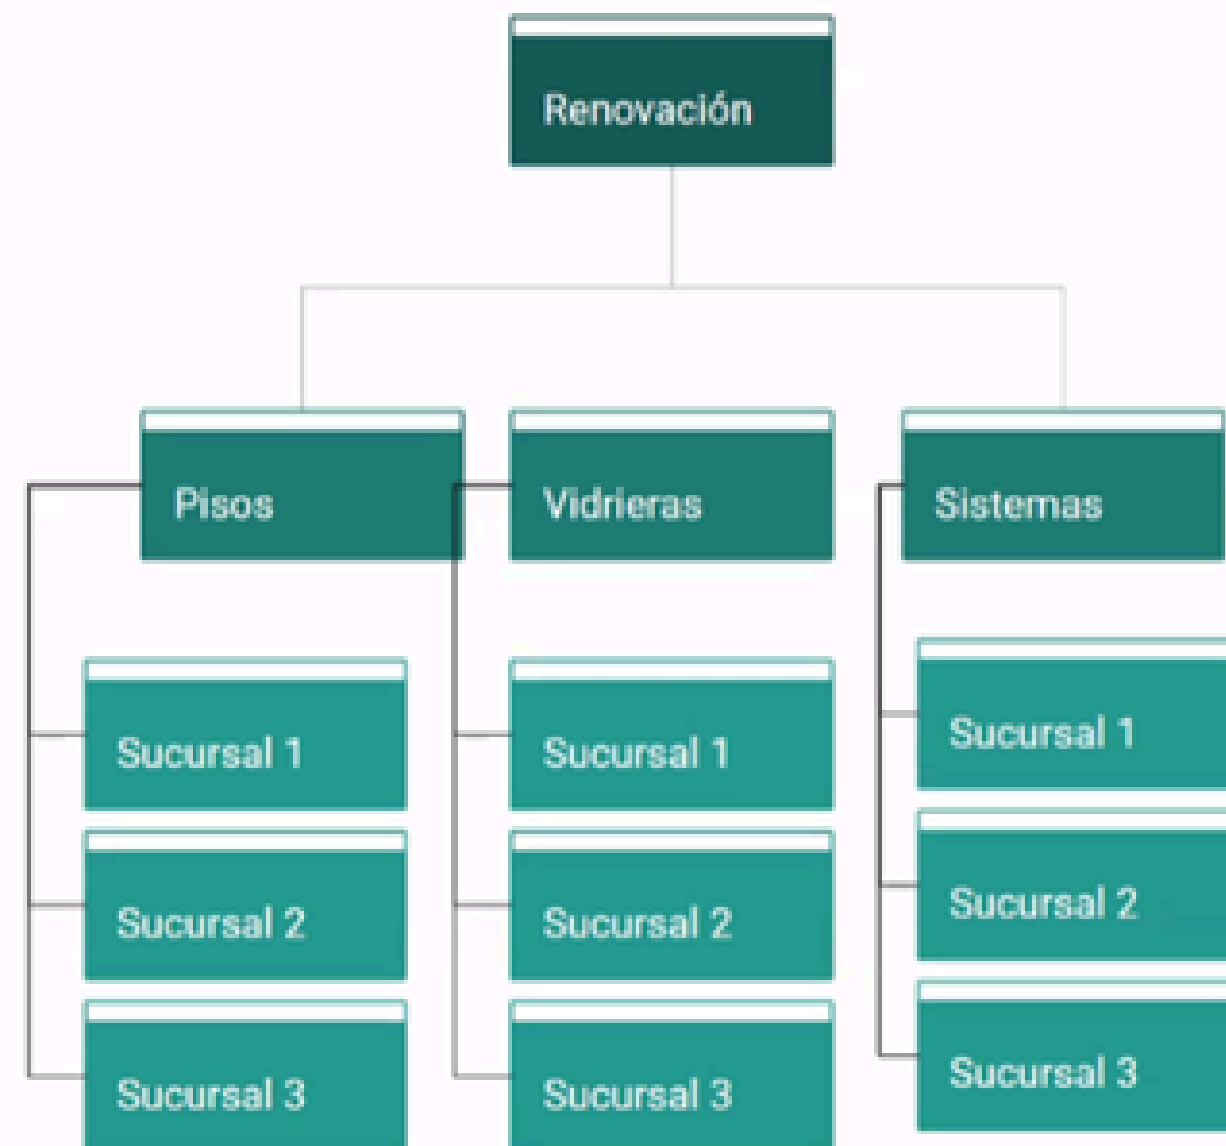



# GUIA PARA EL ARMADO DE EDT

- No todas las ramas deben tener la misma cantidad de niveles
- No preocuparse por la secuencia, la duración o los recursos a asignar a las tareas
- Descomponer solo hasta un nivel adecuado para realizar las estimaciones.
- La división de tareas no debe forzarse. Debe plantearse como una division natural del trabajo
- Cada paquete de trabajo debe tener una duración máxima de 80 horas aprox.

**REGLA DEL 100 %:** Todos los elementos del nivel inferior son el 100% del nivel superior



TP BIBLIOTECA



# PROCESOS DE GESTIÓN DEL ALCANCE

- Planificar la gestión del alcance
- Recopilar los requisitos
- Definir el alcance
- Crear la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)
- Validar el alcance
- Controlar el alcance



# VALIDAR EL ALCANCE

## **VALIDAR EL ALCANCE**

Es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado

## **CONTROLAR LA CALIDAD**

Se ocupa de corroborar la corrección de los entregables y su cumplimiento con los requisitos de calidad especificados para los mismos



# CONTROLAR EL ALCANCE

# CONTROLAR EL ALCANCE

Controlar el Alcance es el proceso en el cual se monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la línea base del alcance.

Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto





MUCHAS  
GRACIAS
