

GESTIÓN DE **PROYECTOS**

CLASE 7

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Cómo asegurar que la información correcta llegue a las **personas correctas** en el momento correcto

¿Escuchaste estas frases alguna vez?

¿Por qué no me avisaron?

¿Por qué no me invitaron a esa reunión?

Esta reunión podría haber sido un mail.

Yo no sabía que esto había cambiado.

ESTAS FRASES REFLEJAN UN PROBLEMA COMÚN: LA INFORMACIÓN EXISTE, **PERO NO LLEGA CORRECTAMENTE A QUIEN LA NECESITA**

APRENDER A COMUNICAR

Muchos proyectos fracasan no por problemas técnicos sino por **problemas de comunicación.**

La comunicación es lo que mantiene alineados:

- el equipo
- el cliente
- la dirección
- los stakeholders

Sin comunicación, el proyecto **pierde dirección**

PRINCIPIOS CLAVE DE LA COMUNICACIÓN



No se puede NO comunicar

Incluso el silencio transmite un mensaje.



Toda acción comunica

No responder un mail, cancelar una reunión o ignorar un mensaje todo transmite algo.



Herramienta central

La comunicación es fundamental para gestionar personas en proyectos.

El Project Manager es básicamente un **facilitador de comunicación** entre personas.

¿Que es la Gestión de las Comunicaciones?

Incluye los procesos necesarios para gestionar la información del proyecto de manera efectiva



Generar

Crear información relevante



Recopilar

Agrupar datos necesarios



Distribuir

Enviar a interesados



Almacenar

Guardar información

¿Que es la Gestión de las Comunicaciones?

La gestión de comunicaciones **no significa solo mandar mails**

Significa diseñar un sistema de comunicación del proyecto.

El objetivo es que:

- todos tengan la información necesaria
- nadie tenga información irrelevante
- las decisiones se comuniquen correctamente.

MODELO DE COMUNICACIÓN



La comunicación no es lineal.

El mensaje que el emisor envía no siempre es el mismo que el receptor entiende debido a experiencias, cultura, conocimiento y estado emocional distintos.

ano



BARRERAS DE COMUNICACIÓN

Diferencias culturales

Interpretaciones distintas según contexto cultural

Lenguaje técnico

Términos especializados que no todos comprenden

Exceso de información

Saturación que dificulta identificar lo importante

Suposiciones

Asunciones incorrectas sobre conocimiento previo

Falta de contexto

Información incompleta que impide comprensión


Muchas veces el problema no es el mensaje sino el contexto


EJEMPLOS DE COMUNICACIÓN

**“Había una vez cuatro individuos
llamados Todo el
Mundo, Alguien, Nadie y Cualquiera.
Siempre que había un trabajo que
hacer, Todo el Mundo estaba seguro de
que Alguien lo haría. Cualquiera podría
haberlo hecho pero Nadie lo
hizo. Alguien se puso nervioso
porque Todo el Mundo tenía el deber de
hacerlo. Al final, Todo el Mundo culpó
a Alguien cuando Nadie hizo lo
que Cualquiera podría haber hecho”.**

Anónimo




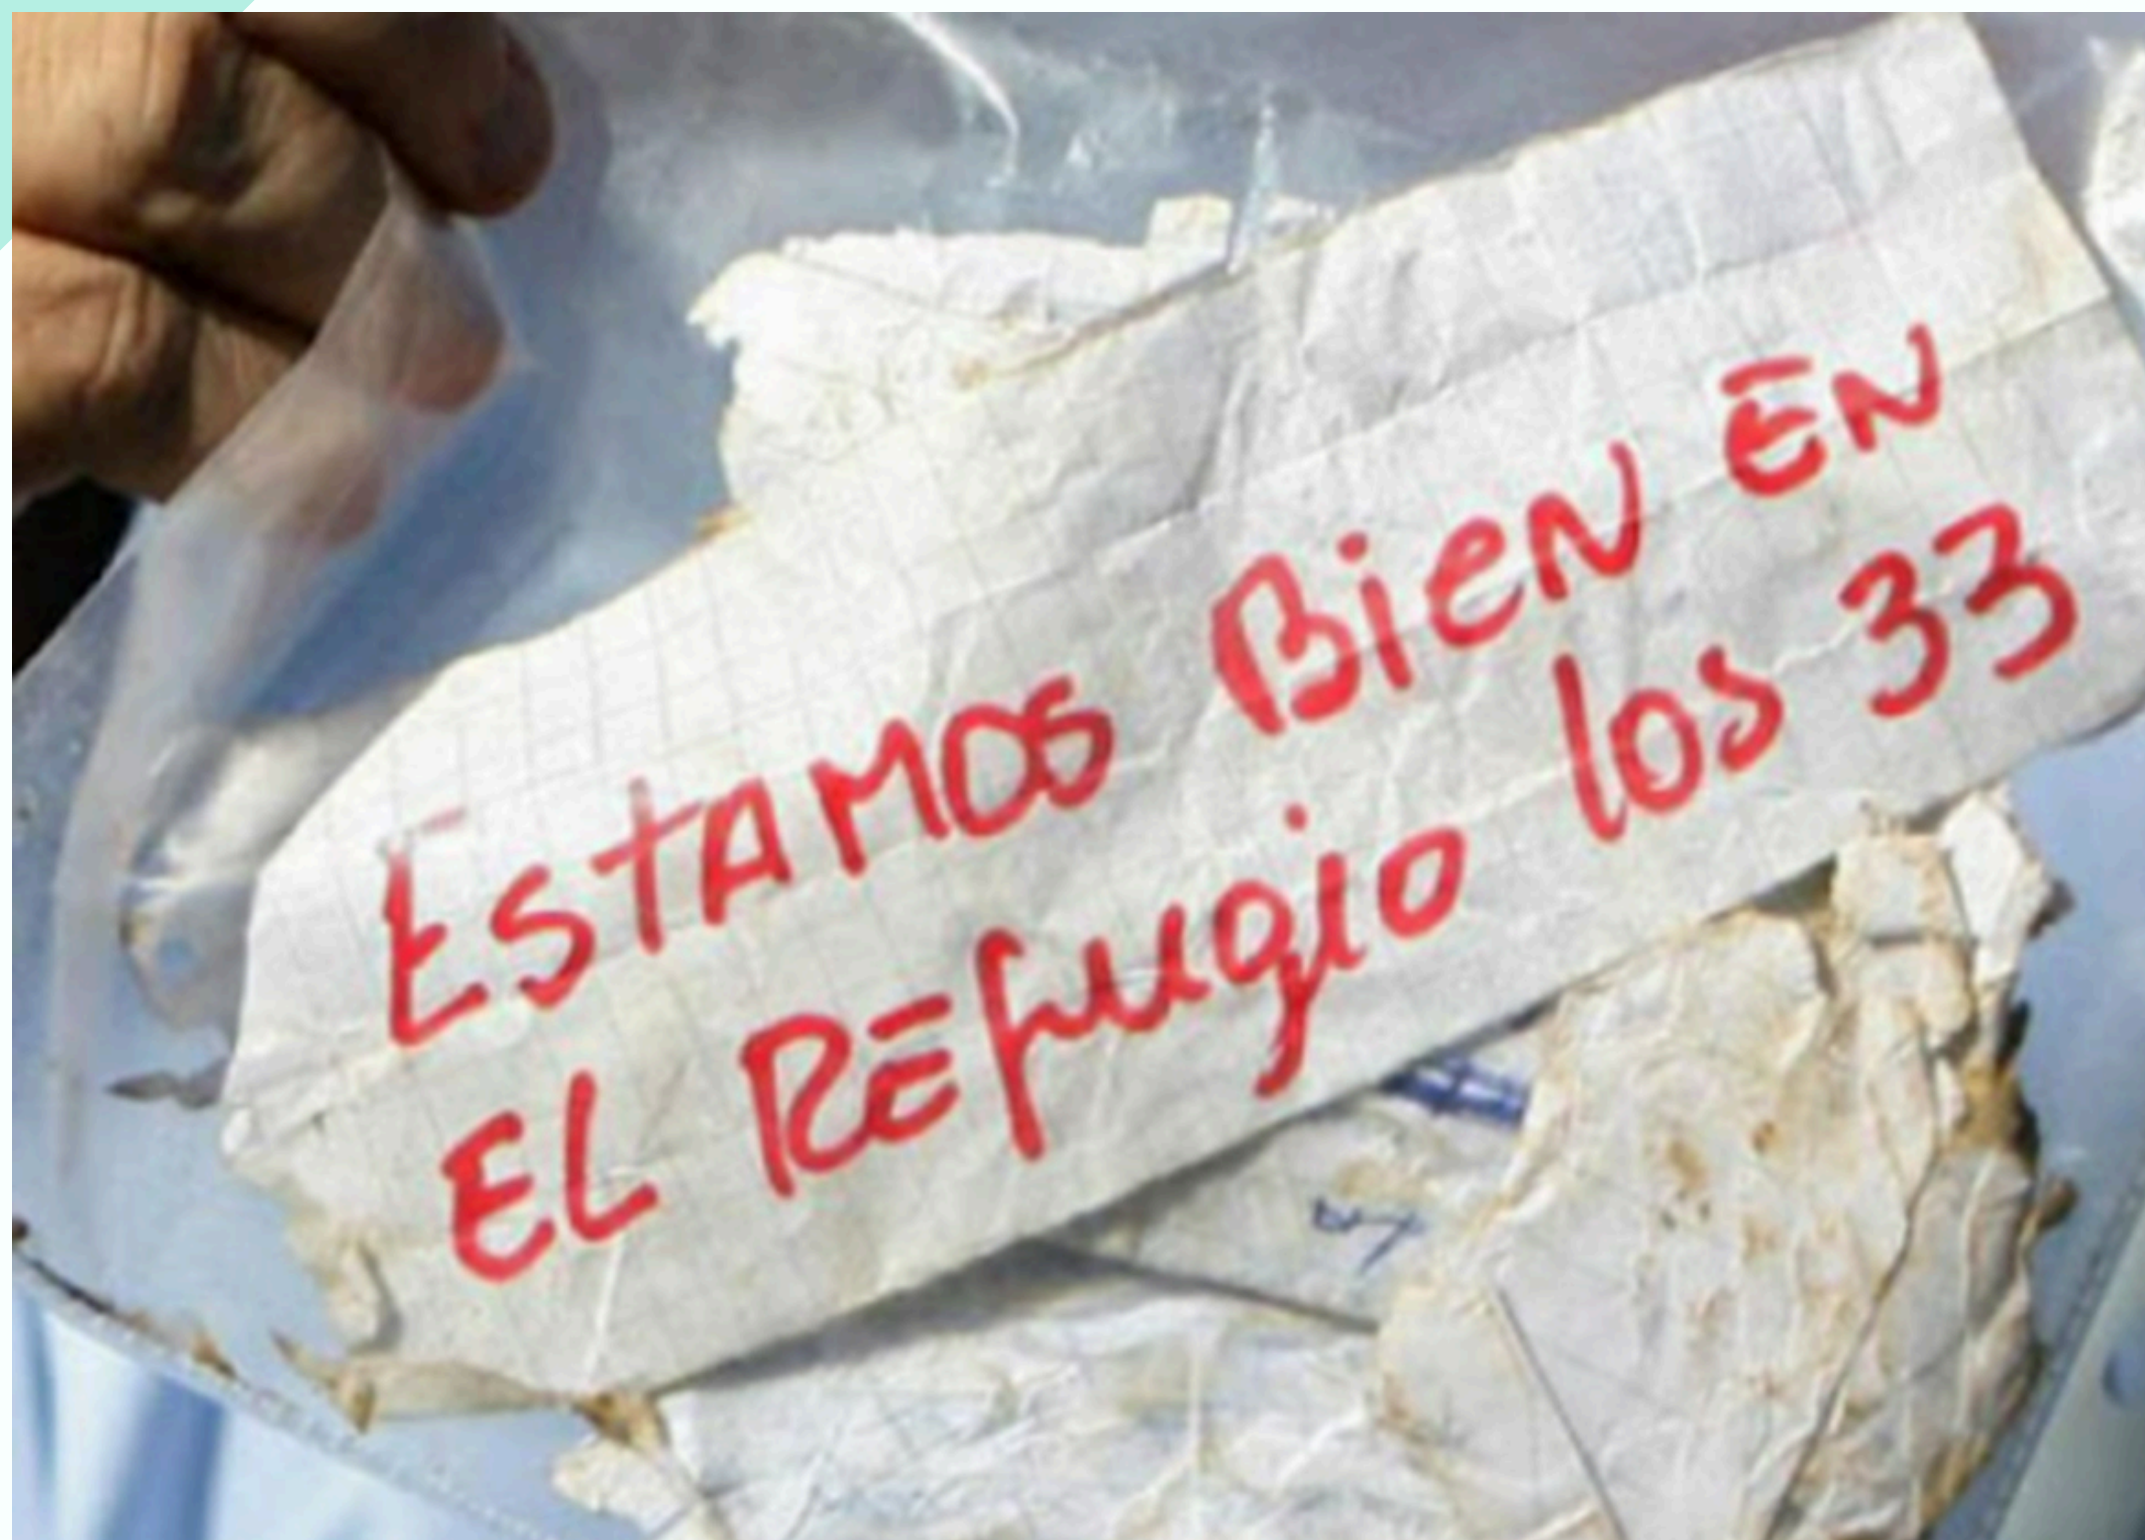

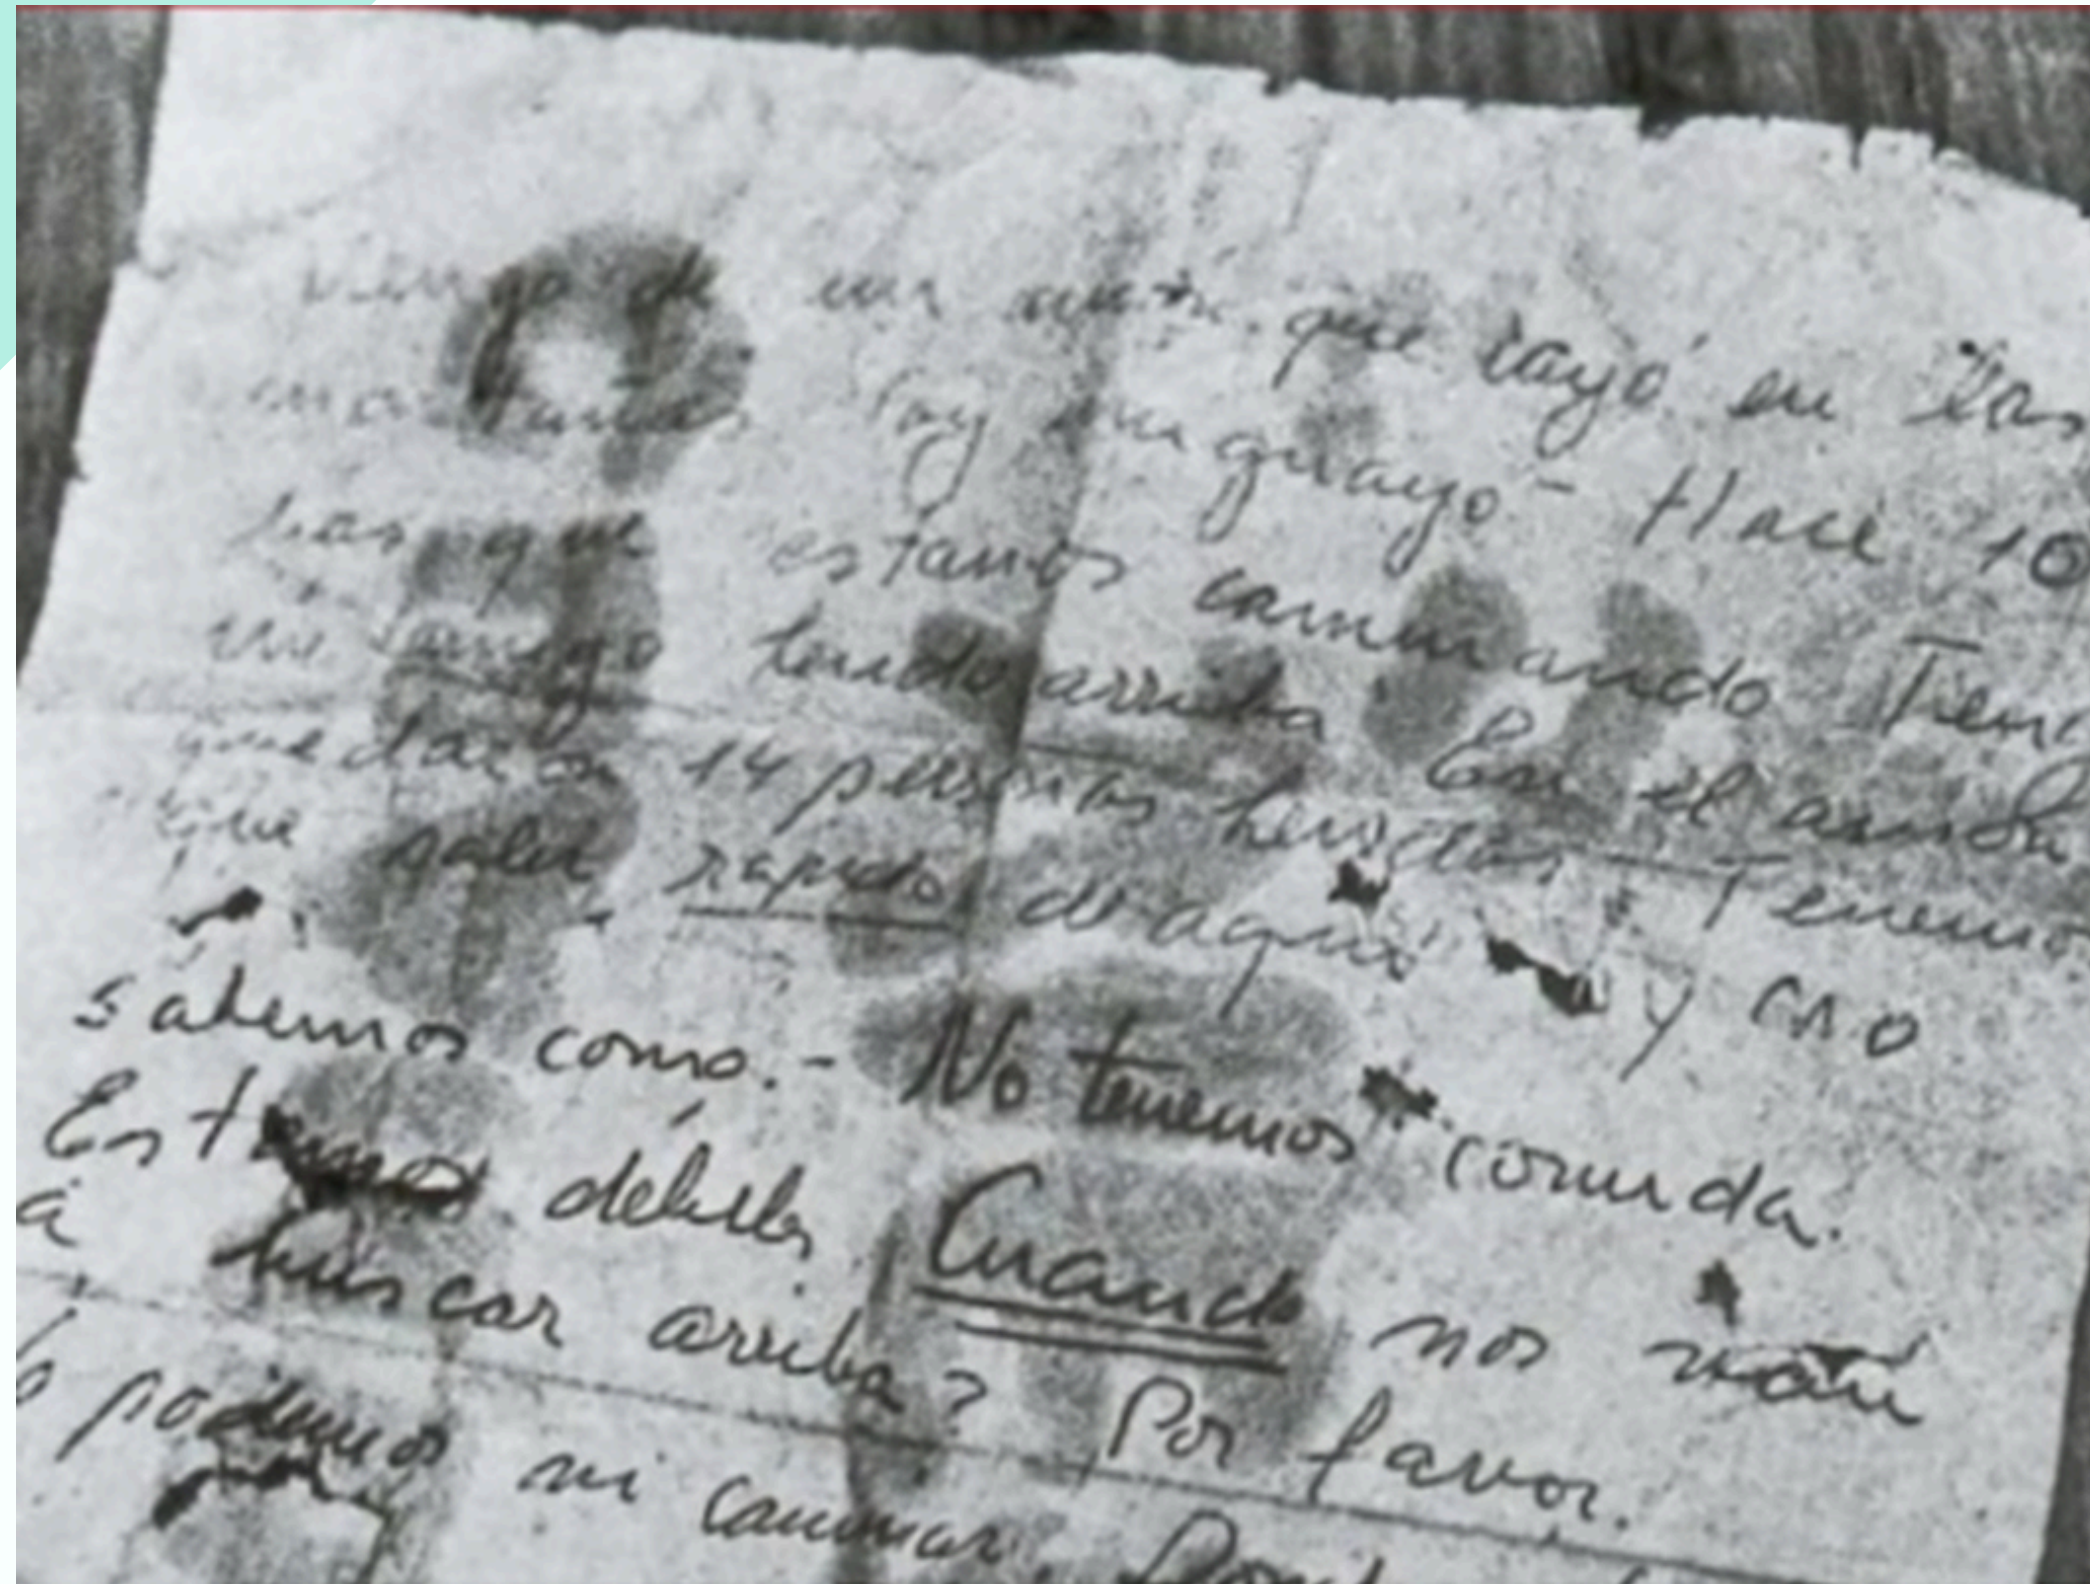


“Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor. No podemos ni caminar. ¿Dónde estamos?”


COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL

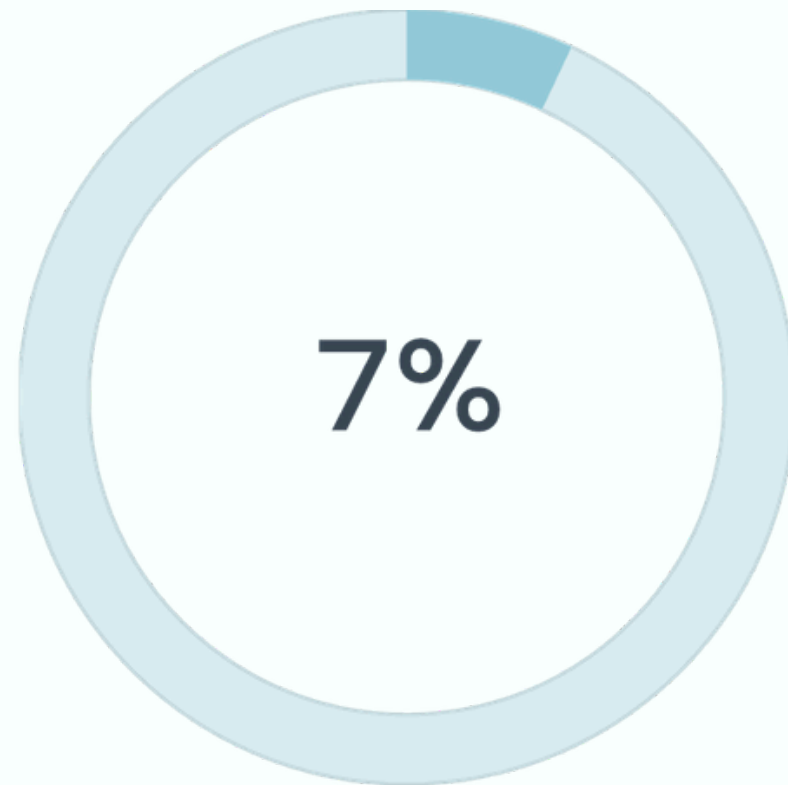

Palabras
Lo que decimos

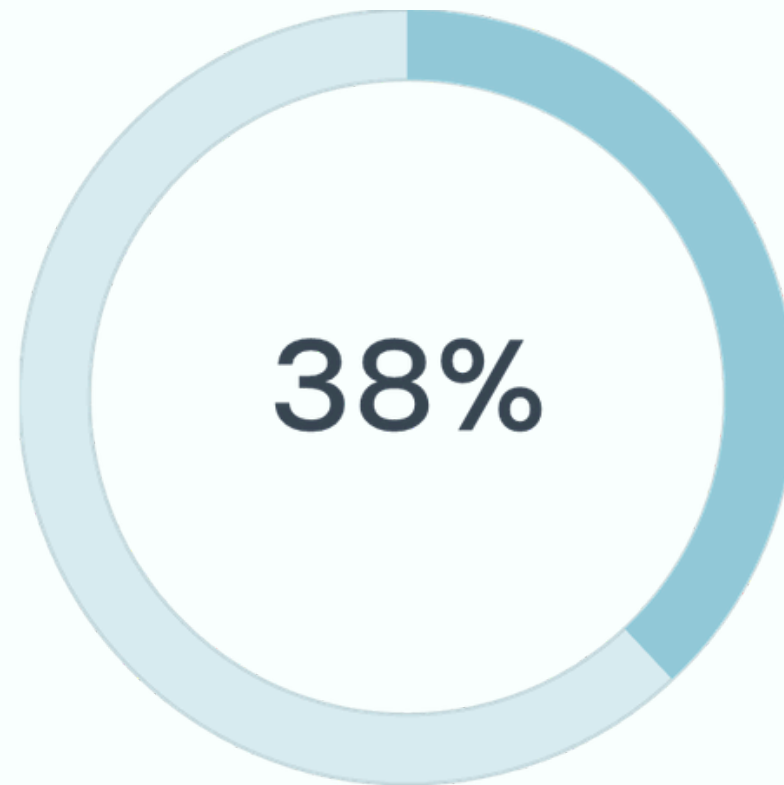

Tono de voz
Cómo lo decimos

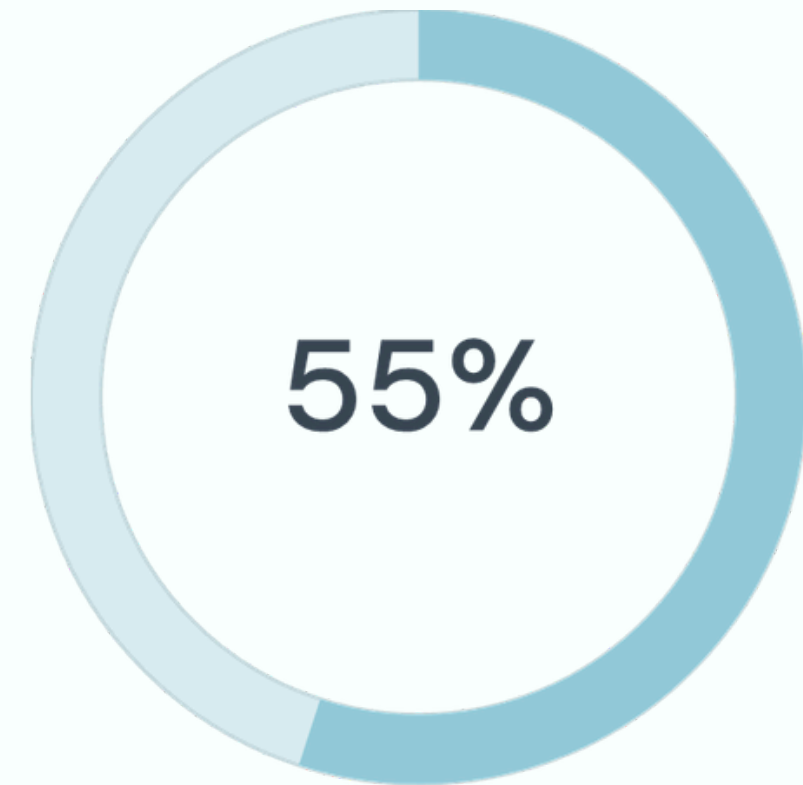

Gestos
Lenguaje corporal

ESTILOS DE COMUNICACIÓN

**No toda comunicación es igual, existen diferentes niveles.
El Project Manager debe manejar todos y cuando aplicar cada uno.**



Interna

Equipo del proyecto, colaboración directa entre miembros del equipo.



Formal

Reportes, reuniones oficiales, presentaciones estructuradas.



Externa

Clientes, proveedores, organismos externos al equipo.



Informal

Chats, conversaciones casuales, correos informales.

COMUNICACIÓN SEGÚN JERARQUÍA



Ascendente

Equipo → Dirección. Reportes de progreso, actualizaciones de estado.



Descendente

Dirección → Equipo. Instrucciones, objetivos, decisiones estratégicas.



Horizontal

Entre miembros del equipo. Coordinación, resolución de problemas.

Cada tipo de comunicación requiere un enfoque y lenguaje distinto

CANALES DE COMUNICACIÓN

$$N = \frac{n(n-1)}{2}$$

10

5 personas

10 canales de comunicación

45

10 personas

45 canales de comunicación

190

20 personas

190 canales de comunicación

Cuanto más personas participan, más interacciones existen y más probabilidades de errores de comunicación aparecen, la cantidad de canales aumenta exponencialmente

LAS 5 C DE LA COMUNICACIÓN

- **CORRECTO** (Gramática y ortografía correctas)
- **CONCISO** (Eliminación del exceso de palabras)
- **CLARO** (Propósito y expresión claros dirigidos a las necesidades del lector)
- **COHERENTE** (Flujo de ideas coherente, lógico)
- **CONTROLADO** (Flujo controlado de palabras e ideas)

TRES ETAPAS PRINCIPALES



Planificar

Definir qué, cómo, cuándo y a quién comunicar



Gestionar

Ejecutar y distribuir la información durante el proyecto



Monitorear

Evaluar si la comunicación está funcionando correctamente

PLANIFICAR LAS COMUNICACIONES

Este proceso ocurre al inicio del proyecto. Se analizan los stakeholders y se define cómo mantenerlos informados.

Es necesario definir:

- **Quién** necesita información
- **Qué** información necesita
- **Cuándo** la necesita
- **Cómo** se le comunicará
- **Quién** será responsable

Buenas intenciones vs Acciones concretas

Mesas de debate



Herramientas & Metodología



Buenas intenciones vs Acciones concretas

Mesas de debate



Herramientas & Metodología



**Sería
bueno
...**


Podríamos

**Habría
que...**

**Tendríamos
que...**

Deberíamos

**Dale,
me lo
llevo...**

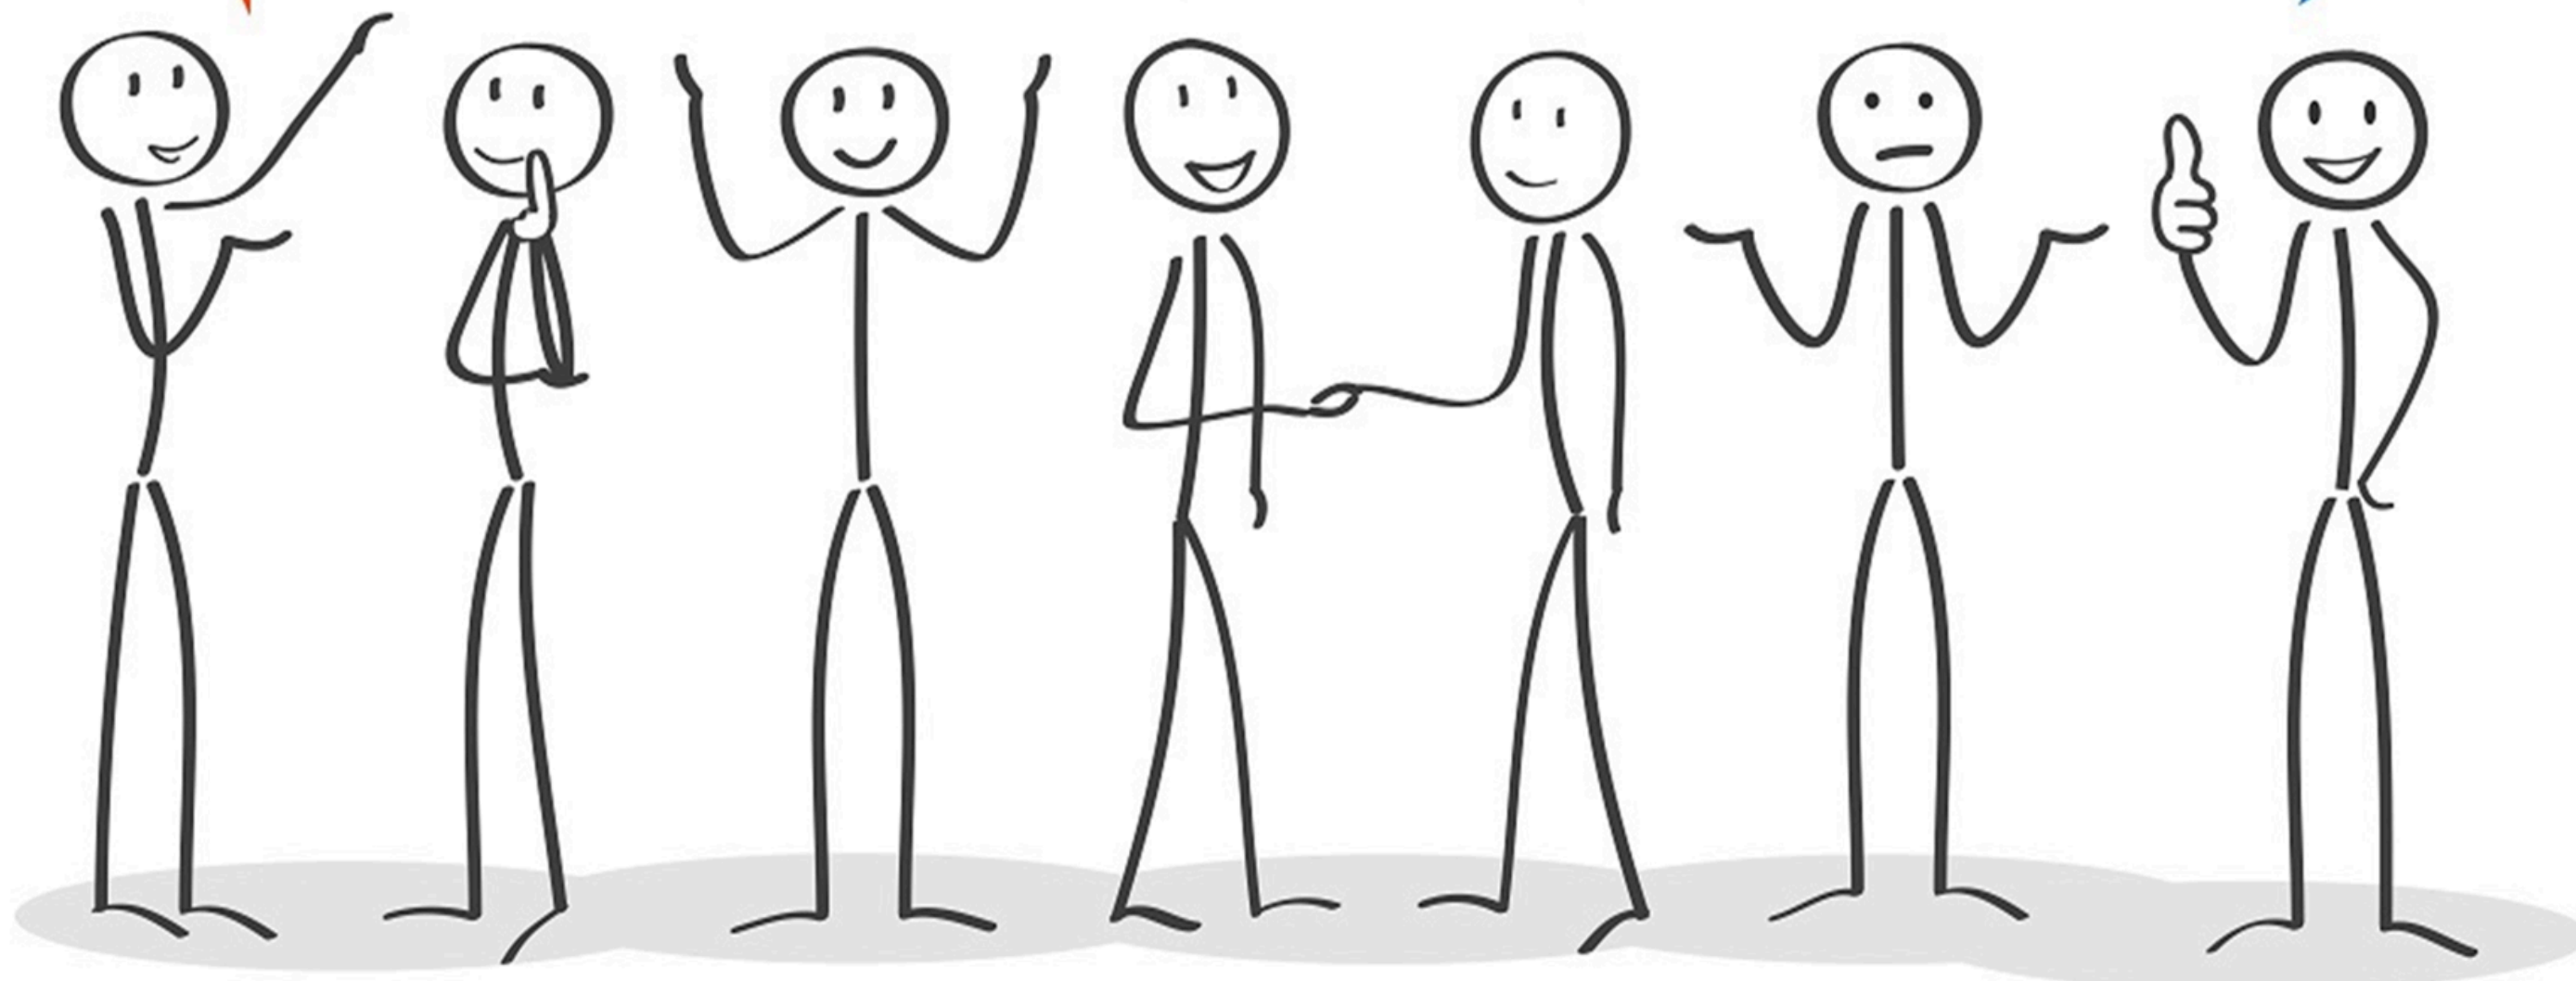

Buenas intenciones vs Acciones concretas

Mesas de debate



Herramientas & Metodología





MÉTODOS DE COMUNICACIÓN



Interactiva

Reuniones, llamadas

Ideal para decisiones y discusiones



Push

Emails, reportes

Útil para comunicar información



Pull

Intranet, repositorios, dashboards

Consultan cuando lo necesiten

Cada tipo tiene ventajas:

Interactiva es mejor para decisiones.

Push es útil para comunicar información.

Pull permite que las personas consulten cuando lo necesiten

PLAN DE COMUNICACIONES



Información a comunicar



Frecuencia



Stakeholders receptores



Formato



Responsables



Tecnología utilizada

Este documento funciona como el mapa de comunicación del proyecto

MATRIZ DE COMUNICACIONES

Esta tabla es una de las herramientas más utilizadas para visualizar rápidamente qué información circula y a quién.

Información	Stakeholder	Medio	Frecuencia	Responsable
Avance del proyecto	Sponsor	Reporte	Mensual	PM
Reunión equipo	Equipo	Meeting	Semanal	PM
Cambios alcance	Cliente	Email	Eventual	PM

GESTIONAR LAS COMUNICACIONES

Este proceso ocurre durante todo el proyecto. El Project Manager debe asegurarse de que la **información fluya correctamente**.

Actividades principales:

- Generar información
- Distribuir información
- Facilitar discusiones
- Responder solicitudes

MONITOREAR LAS COMUNICACIONES

Encuestas

Recopilar feedback de stakeholders sobre la efectividad de las comunicaciones

Feedback del equipo

Reuniones y conversaciones para identificar problemas de comunicación

Revisión de incidentes

Analizar problemas causados por fallos en la comunicación



BENEFICIOS DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA



Alinear expectativas

Garantizar que todos los stakeholders tengan la misma comprensión del proyecto



Acelerar decisiones

Proporcionar información oportuna para tomar decisiones rápidas



Reducir conflictos

Prevenir malentendidos y resolver problemas antes de que escalen



Mejorar resultados

Incrementar la probabilidad de éxito del proyecto

BUSCAR UNA BUENA COMUNICACIÓN

Un Project Manager dedica gran parte de su tiempo a comunicar

Mensaje correcto

Información precisa y relevante

Stakeholder correcto

La persona adecuada en el momento adecuado

Momento correcto

Comunicación oportuna y estratégica

ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL TP

- **Realizar la matriz de comunicaciones para los stakeholders de cada proyecto**
